

ÖN TASARIM VE YATIRIM DOSYASI

# MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

MALTEPE / İDEALTEPE · İSTANBUL

Net iç kullanım alanı 103,78 m<sup>2</sup> · ön bahçe 24,39 m<sup>2</sup> · arka bahçe 32,82 m<sup>2</sup>

## REVİZYON

Rev B

## TARİH

13 Eylül 2026

## DURUM

Ön tasarım — yerinde doğrulanacak

## ÖLÇÜ DAYANAĞI

Raster paftadan ölçeklendirme ±%3

Bu dosya ruhsat başvurusu yerine geçmez; uygulama öncesi proje müellifi onayı ve kurum izinleri zorunludur.



Maltepe / İdealtepe'de kirası imzalanmış, hâlen mobilya mağazası olarak kullanılan 103,78 m² net kullanım alanlı ticari birim, mevcut TRIMODE yerleşimi korunarak butik bir fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüştürülmektedir. Ekipman işverence satın alınmış olduğundan yerleşim mevcut ekipman ölçülerine göre çözülmüş, ekipman bedeli bütçe dışında bilgi satırı olarak gösterilmiştir. Tasarım ilkesi: duvar hareketini asgaride tutmak ve bütçeyi ıslak hacim, zemin ve aydınlatma-havalandırma olmak üzere üç başlıkta yoğunlaştırmak. Dosyanın en kritik çıktısı 3. sayfadaki uygunluk kontrolüdür: kira imzalanmış olduğundan mekânın fiziki uygunluğu artık bir seçim değil, yönetilmesi gereken bir risktir.

### 1 MEVZUAT SIRASI

Önce İstanbul GSİM tesis açılış izni ve komisyon tetkiki, sonra Maltepe Belediyesi işyeri açma ruhsatı. Belediye GSİM uygunluk yazısını ister; sıra ters kurulursa süreç başa döner.

### 2 ISLAK HACİM

Maliyetin kalbi. Mevcut iki blok korunur, içleri komple yenilenir: her blokta 1 duş + 1 WC → toplam 2+2. Gider kotu yerçekimiyle çözülmezse Seçenek A (zemin yükseltme) devreye girer.

### 3 ZEMİN STRATEJİSİ

Üç bölge: arena/serbest ağırlıkta 40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı, fonksiyonel-kardiyo alanında 20 mm kauçuk, dinlenme ve girişte LVT. Islak hacim R11 kaymaz seramik.

### 4 BÜTÇE YAKLAŞIMI

Tek m² fiyatı kullanılmadı; 46 poz üzerinden kalem bazlı, düşük-yüksek bantlı kuruldu. %9 şantiye genel gideri ve %15 beklenmedik payı ayrıca eklendi.

#### NET İÇ ALAN

**103,78 m²**

salon 87,05 + ıslak 16,73

#### KAPASİTE

**12 kişi**

seans başı eşzamanlı · 65,14 m² serbest sirkülasyon

#### TADİLAT BÜTÇESİ

**1,62-2,92 M₺**

önerilen senaryo · Seçenek A · Eylül 2026 piyasa mertebesi

#### RUHSAT ZİNCİRİ

**16-28 hafta**

ön görüşten belediye ruhsatına, adım 0-10

#### ŞANTİYE SÜRESİ

**11 hafta**

14 adımlık iş programı · kritik yol ıslak hacim

#### BEKLENMEDİK PAY

**%15**

+ %9 şantiye genel gideri

#### EN KRİTİK TEK BULGU — ÖNCE BUNU ÇÖZ

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri mevzuatının il müdürlüklerince yaygın uygulanan biçiminde spor salonlarında en az 125 m² çalışma alanı, 15'er m² kadın/erkek soyunma odası ve 15 m² dinlenme salonu ile toplam en az 170 m² ve 2,50 m tavan yüksekliği aranmaktadır. Bu birimin net iç alanı 103,78 m²'dir. Kapalı alanı artırmak için bahçelerin kapatılması işveren kararıyla kapsam dışıdır: ön (24,39 m²) ve arka bahçe (32,82 m²) açık kullanımda kalır ve hiçbir alan hesabına girmez. Buna karşılık yönetmelik metninin kendisi salon için asgari m² şartı getirmez — yalnızca soyunma odası için 8 m² ve dinlenme salonu için 15 m² der; bu iki şart mevcut planda sağlanmaktadır (8,24 / 8,49 ve 17,33 m²). Karar bu nedenle teknik değil idaridir ve tek çözüm yolu İstanbul GSİM'den YAZILI ÖN GÖRÜŞ almaktır. Aşağıdaki üç rota, ön görüşün üç olası sonucuna karşılık gelir.

### R1 ÖN GÖRÜŞ OLUMLU

GSİM yönetmelik metnini esas alır ve mevcut alanı yeterli görür. Bu dosya olduğu gibi uygulanır; ek maliyet yoktur. En hızlı senaryo — tadilat 3. adımda başlar.

### R2 KAPSAM REVİZYONU

Tesis, çok kullanıcılı 'spor salonu' yerine randevulu kişisel antrenman / özel ders stüdyosu olarak konumlanır; ring zaten bire bir ve küçük grup çalışmasına uygundur. GSİM tescil kapsamı ve belediye NACE kodu buna göre seçilir. Hukuki görüş şarttır; yanlış kodla açılış denetimde kapatma riski taşır.

### R3 SÖZLEŞME YOLU

İki rota da kapanırsa mesele mimari değil ticarîdir: kira sözleşmesindeki fesih veya indirim imkânı avukatla değerlendirilir, gerekirse mal sahibiyle yeniden görüşülür. Bu yüzden ön görüş başvurusu ilk aydan geç kalmamalıdır — sözleşmede manevra alanı süreyle daralır.

Her üç rotada da ortak olan tek şey şudur: yazılı ön görüş alınmadan imalata başlanması, tescil reddi hâlinde harcanan tüm tadilat bedelini geri dönüşü olmayan biçimde riske atar. Bahçelerin kapatılması yoluyla alan kazanımı işveren kararıyla değerlendirme dışıdır.

5 madde · KIRMIZI

Projeyi durdurabilir. Çözülmeden imalata başlanmamalıdır.

14 madde · SARI

Tasarım veya bütçeyle çözülür; veri eksikliği nedeniyle açık.

9 madde · YEŞİL

Bu dosyadaki tasarım ve BoQ ile karşılanmaktadır.

| YÖNETMELİK / UYGULAMA ŞARTI                                                    | MEVCUT DURUM                                                         | GEREKLİ AKSİYON                                                                                                                                                                   | RİSK    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Çalışma (salon) alanı — GSİM uygulamasında yaygın olarak ≥125 m²               | Salon 87,05 m² · net iç toplam 103,78 m²                             | GSİM'den YAZILI ÖN GÖRÜŞ al. Olumsuzsa tescil kapsamının daraltılması (randevulu stüdyo) veya kira sözleşmesinin yeniden görüşülmesi. Bahçeler kapatılmayacaktır — işveren kararı | KIRMIZI |
| Toplam tesis alanı — uygulamada ≥170 m² (125+15+15+15)                         | 103,78 m² · açık 66,22 m² eksik                                      | Aynı karar ağıacı. Kapalı alan artırımını GÜNDEMDE DEĞİL: ön ve arka bahçe açık kullanımda kalır, hiçbir alan hesabına dâhil edilmez                                              | KIRMIZI |
| İki ayrı soyunma odası (kadın + erkek)                                         | VAR — 8,24 m² (erkek) / 8,49 m² (kadın) blok                         | Korunuyor; iç bölme yenilenecek                                                                                                                                                   | YEŞİL   |
| Soyunma odası kullanım alanı ≥8 m²                                             | Blok toplamı sağlıyor; duş+WC hariç net 4,48 / 5,59 m²               | Ölçümün blok toplamı üzerinden mi yapıldığı GSİM'e yazılı sorulacak                                                                                                               | SARI    |
| Soyunma odalarının İÇİNDE en az 2 duş + 2 tuvalet                              | Konsept planda her blokta 1 duş + 1 WC → toplam 2+2                  | İmalat BoQ 03.05 / 03.06 ile karşılanıyor                                                                                                                                         | YEŞİL   |
| Çalışma boyunca sürekli sıcak su                                               | Kaynak bilinmiyor (doğalgaz / elektrik?)                             | 2×6 kW elektrikli ani ısıtıcı — poz 03.07. Doğalgaz varsa kombi daha ekonomik                                                                                                     | SARI    |
| Dinlenme salonu ≥15 m², zemini halıfleks/parke vb.                             | Kuzey kol → 17,33 m², LVT/laminat parke                              | Sağlanıyor — plan sabitlenmeli                                                                                                                                                    | YEŞİL   |
| Sporcu sayısı kadar soyunma dolabı / askılık                                   | Mevcut yok                                                           | 24 göz dolap + 2 bank — poz 08.02                                                                                                                                                 | YEŞİL   |
| Salon ısısı ≥18 °C                                                             | Mevcut ısıtma bilinmiyor                                             | 3 × 24.000 BTU split küme (57.000 BTU hesaplandı) — poz 06.01                                                                                                                     | YEŞİL   |
| Sporcu sayısına göre yeterli havalandırma                                      | Mekanik havalandırma yok                                             | 1.000 m³/h taze hava = 3,0 hava değişimi/saat = 71 m³/h-kşi — poz 06.02                                                                                                           | YEŞİL   |
| Zeminin spor dalına uygun malzemeyle kaplanması                                | Mağaza zemini — çıplak/mobilya kaplaması                             | 3 bölgeli kauçuk (40/20 mm) + LVT + ıslak hacim R11 seramik                                                                                                                       | YEŞİL   |
| Yangın söndürme ekipmanı · itfaiye uygunluk raporu                             | Mevcut değil                                                         | 4 adet 6 kg KKT + algılama paneli; İBB İtfaiye denetim başvurusu                                                                                                                  | SARI    |
| Keskin köşe ve kolonların darbe hafifletici kaplanması                         | Kolonlar çıplak                                                      | 18 m köşe/kolon kaplaması — poz 09.03                                                                                                                                             | YEŞİL   |
| Engellilere ve can güvenliğine yönelik tedbirler                               | Giriş eşiği ve WC uygunluğu bilinmiyor                               | Rampa, tutamak, kapı genişliği düzenlemesi — poz 09.04                                                                                                                            | SARI    |
| Tavan yüksekliği (uygulamada ≥2,50 m)                                          | VARSAYIM 3,20 m — ÖLÇÜLMEDİ                                          | Yerinde ölçüm — tüm mekanik/aydınlatma hesabının girdisi                                                                                                                          | SARI    |
| Bağımsız bölüm niteliği · yapı kullanma izni (iskân)                           | Bilinmiyor                                                           | Tapu kaydı + iskân belgesi kontrolü — ruhsatın ön şartı                                                                                                                           | KIRMIZI |
| Kat malikleri muvafakatnamesi (bina bağımsız değilse)                          | Bilinmiyor                                                           | Yönetim planı incelenmeli; spor salonu için muvafakat gerekebilir — ruhsatı bloke eder                                                                                            | KIRMIZI |
| Mevcut pis su bağlantı kotu ve konumu                                          | Bilinmiyor                                                           | Islak hacim Seçenek A (zemin yükseltme) / B (pompa) kararını belirler                                                                                                             | KIRMIZI |
| Elektrik pano gücü ve trifaze durumu                                           | Bilinmiyor                                                           | Hesaplanan kurulu güç 16,2 kW / talep 12,1 kW — trifaze 3×25 A abonelik gerekir                                                                                                   | SARI    |
| Mimar onaylı 1/100 vaziyet ve yerleşim planı                                   | Yok                                                                  | GSİM ve belediye dosyasının zorunlu eki — proje müellifi tayini                                                                                                                   | SARI    |
| Anlaşmalı doktor / sağlık memuru / klinik sözleşmesi                           | Yok                                                                  | GSİM dosya eki — açılış öncesi imzalanır                                                                                                                                          | SARI    |
| Federasyon veya il müdürlüğü onaylı antrenör sözleşmesi                        | Yok                                                                  | Her spor dalı için ayrı; işletmeci bizzat ders verecekse SGM antrenörlük belgesi                                                                                                  | SARI    |
| Üst katta konut — gürültü / titreşim şikâyeti riski                            | VARSAYIM: üstte konut var                                            | Arena altında 40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı — poz 04.01 / 04.02                                                                                                              | SARI    |
| Soyunma ve dinlenme odalarında aydınlatma, havalandırma, 18 °C ısı ve hijyen   | Tasarımda karşılanıyor: 6 IP44 armatür, 240 m³/h egzoz, klima kümesi | Yönetmelik bu şartı salon için değil ODALAR için ayrıca arıyor — komisyon tetkikinde her hacim tek tek bakılır. Temizlik protokolü yazılı hâle getirilmeli                        | YEŞİL   |
| Birimin kat konumu — bodrum katta mı?                                          | BİLİNİYOR — paftada kot bilgisi yok                                  | Bodrum konumundaki salonlarda ÖZEL havalandırma donanımı zorunludur; bu durumda poz 06.02 yeniden boyutlandırılır                                                                 | SARI    |
| İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ve onay raporu · personel hijyen eğitimi belgesi | Yok                                                                  | GSİM dosyasının ve belediye ruhsatının zorunlu eki — yol haritası adım 5                                                                                                          | SARI    |
| Çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu (müzik yayını yapılacaksa)      | Değerlendirilmedi                                                    | Belediye, müzik yayını yapan işletmelerden isteyebilir. Üst katta konut varsa talep olasılığı yüksek — ölçüm ve rapor bedeli bütçeye alınmalı                                     | SARI    |
| Otopark / sığınak yükümlülüğü (kullanım değişikliği nedeniyle)                 | Değerlendirilmedi                                                    | Mağazadan spor salonuna kullanım değişikliği belediyede otopark yükümlülüğü doğurabilir; Ruhsat Müdürlüğü'ne adım 0'da sorulmalı                                                  | SARI    |

KIRMIZI MADDELER — ÇÖZÜM VE MALİYET ETKİSİ

| KIRMIZI MADDE                            | ÇÖZÜM YOLU                                                                                                                                                    | MALİYET / TAKVİM ETKİSİ                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma alanı / toplam tesis alanı eşiği | GSİM'den yazılı ön görüş (R1). Olumsuzsa kapsam revizyonu (R2) veya kira sözleşmesi yolu (R3). Bahçe kapatarak alan kazanımı işveren kararıyla kapsam dışıdır | Ön görüş: harç dışında maliyetsiz · R2: hukuki görüş bedeli · R3: sözleşme müzakeresi |
| Bağımsız bölüm niteliği / iskân          | Tapu ve yapı kullanma izin belgesinin çıkarılması; niteliği uygun değilse tapu tashihi                                                                        | Belge temini düşük bedelli; tashih gerekirse süre etkisi 4–10 hafta                   |
| Kat malikleri muvafakatnamesi            | Yönetim planının incelenmesi, muvafakat toplanması; gürültü önlemlerinin argüman olarak sunulması                                                             | Doğrudan bedeli yok; alınamazsa ruhsat çıkamaz — projeyi durdurur                     |
| Pis su bağlantı kotu                     | Söküm sonrası ilk iş kot ölçümü; Seçenek A (zemin yükseltme) hazır, olmazsa Seçenek B (pompa)                                                                 | A: 14.220–23.422 TL · B: 72.000–128.000 TL (aradaki fark bütçenin %2–4'ü)             |

Yerel uygulama farklılık gösterebilir; Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden güncel liste teyit edilmelidir.

# MEVCUT DURUM VE ALAN DAĞILIMI

TRIMODE yerleşim / duvar / alan dağılımı paftalarından üretilmiştir

04

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev B



## ALAN DAĞILIMI

| BÖLÜM                    | M²     | KAYNAK / NOT                |
|--------------------------|--------|-----------------------------|
| Salon (açık satış alanı) | 87,05  | Pafta etiketi · gri         |
| Erkek soyunma bloğu      | 8,24   | Pafta etiketi · mavi        |
| Kadın soyunma bloğu      | 8,49   | Pafta etiketi · pembe       |
| NET İÇ KULLANIM ALANI    | 103,78 | Tüm hesapların temeli       |
| Ön bahçe (açık)          | 24,39  | Kapalı alana dâhil değil    |
| Arka bahçe (açık)        | 32,82  | Kapalı alana dâhil değil    |
| Bahçe toplamı            | 57,21  | Kapatma senaryosunun konusu |

## SÖKÜM KAPSAMI (mobilyacıdan kalan imalatlar)


| İŞ                                             | METRAJ    |
|------------------------------------------------|-----------|
| Raf, vitrin, teşhir podyumu, tezgâh sökümü     | 103,78 m² |
| Mevcut zemin kaplaması sökümü ve şap tesviyesi | 103,78 m² |
| Islak hacim seramik + vitrifiye sökümü         | 16,73 m²  |
| Mevcut aydınlatma, kablaj ve zayıf akım sökümü | komple    |
| Moloz yükleme, indirme, nakliye (konteyner)    | götürü    |

### ÖLÇÜ DAYANAĞI VE DOĞRULUK

Teslim edilen DWG dosyası AutoCAD 2018 (AC1032) formatındadır ve bu ortamda açılamamıştır; PDF paftaları ise vektör değil JPEG raster olarak üretilmiştir. Bu nedenle geometri, alan dağılımı paftasındaki renk alanları izlenerek vektörleştirilmiş ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edilmiştir; üç bölgede sapma %3'ün altındadır. Uygulama projesi için işverenden DXF (R2010) export istenmelidir.

## YERİNDE TESPİT LİSTESİ — ölçüm günü doldurulacak

| TESPİT EDİLECEK                          | BİRİM      | ŞU ANKI KABUL |
|------------------------------------------|------------|---------------|
| Tavan yüksekliği (salon / ıslak hacim)   | m          | VARSAYIM 3,20 |
| Pis su bağlantı kotu ve konumu           | cm / kroki | —             |
| Elektrik pano gücü · trifaze var mı      | kW / E-H   | —             |
| Doğalgaz bağlantısı var mı               | E-H        | —             |
| Üst katta konut var mı                   | E-H        | VARSAYIM: var |
| Kolon sayısı, kesiti ve konumu           | adet / cm  | —             |
| Cephe doğrama genişliği ve kapı açıklığı | cm         | —             |
| Zemin kotu farkı (giriş eşiği)           | cm         | —             |
| Mevcut aydınlatma ve pano konumu         | kroki      | —             |

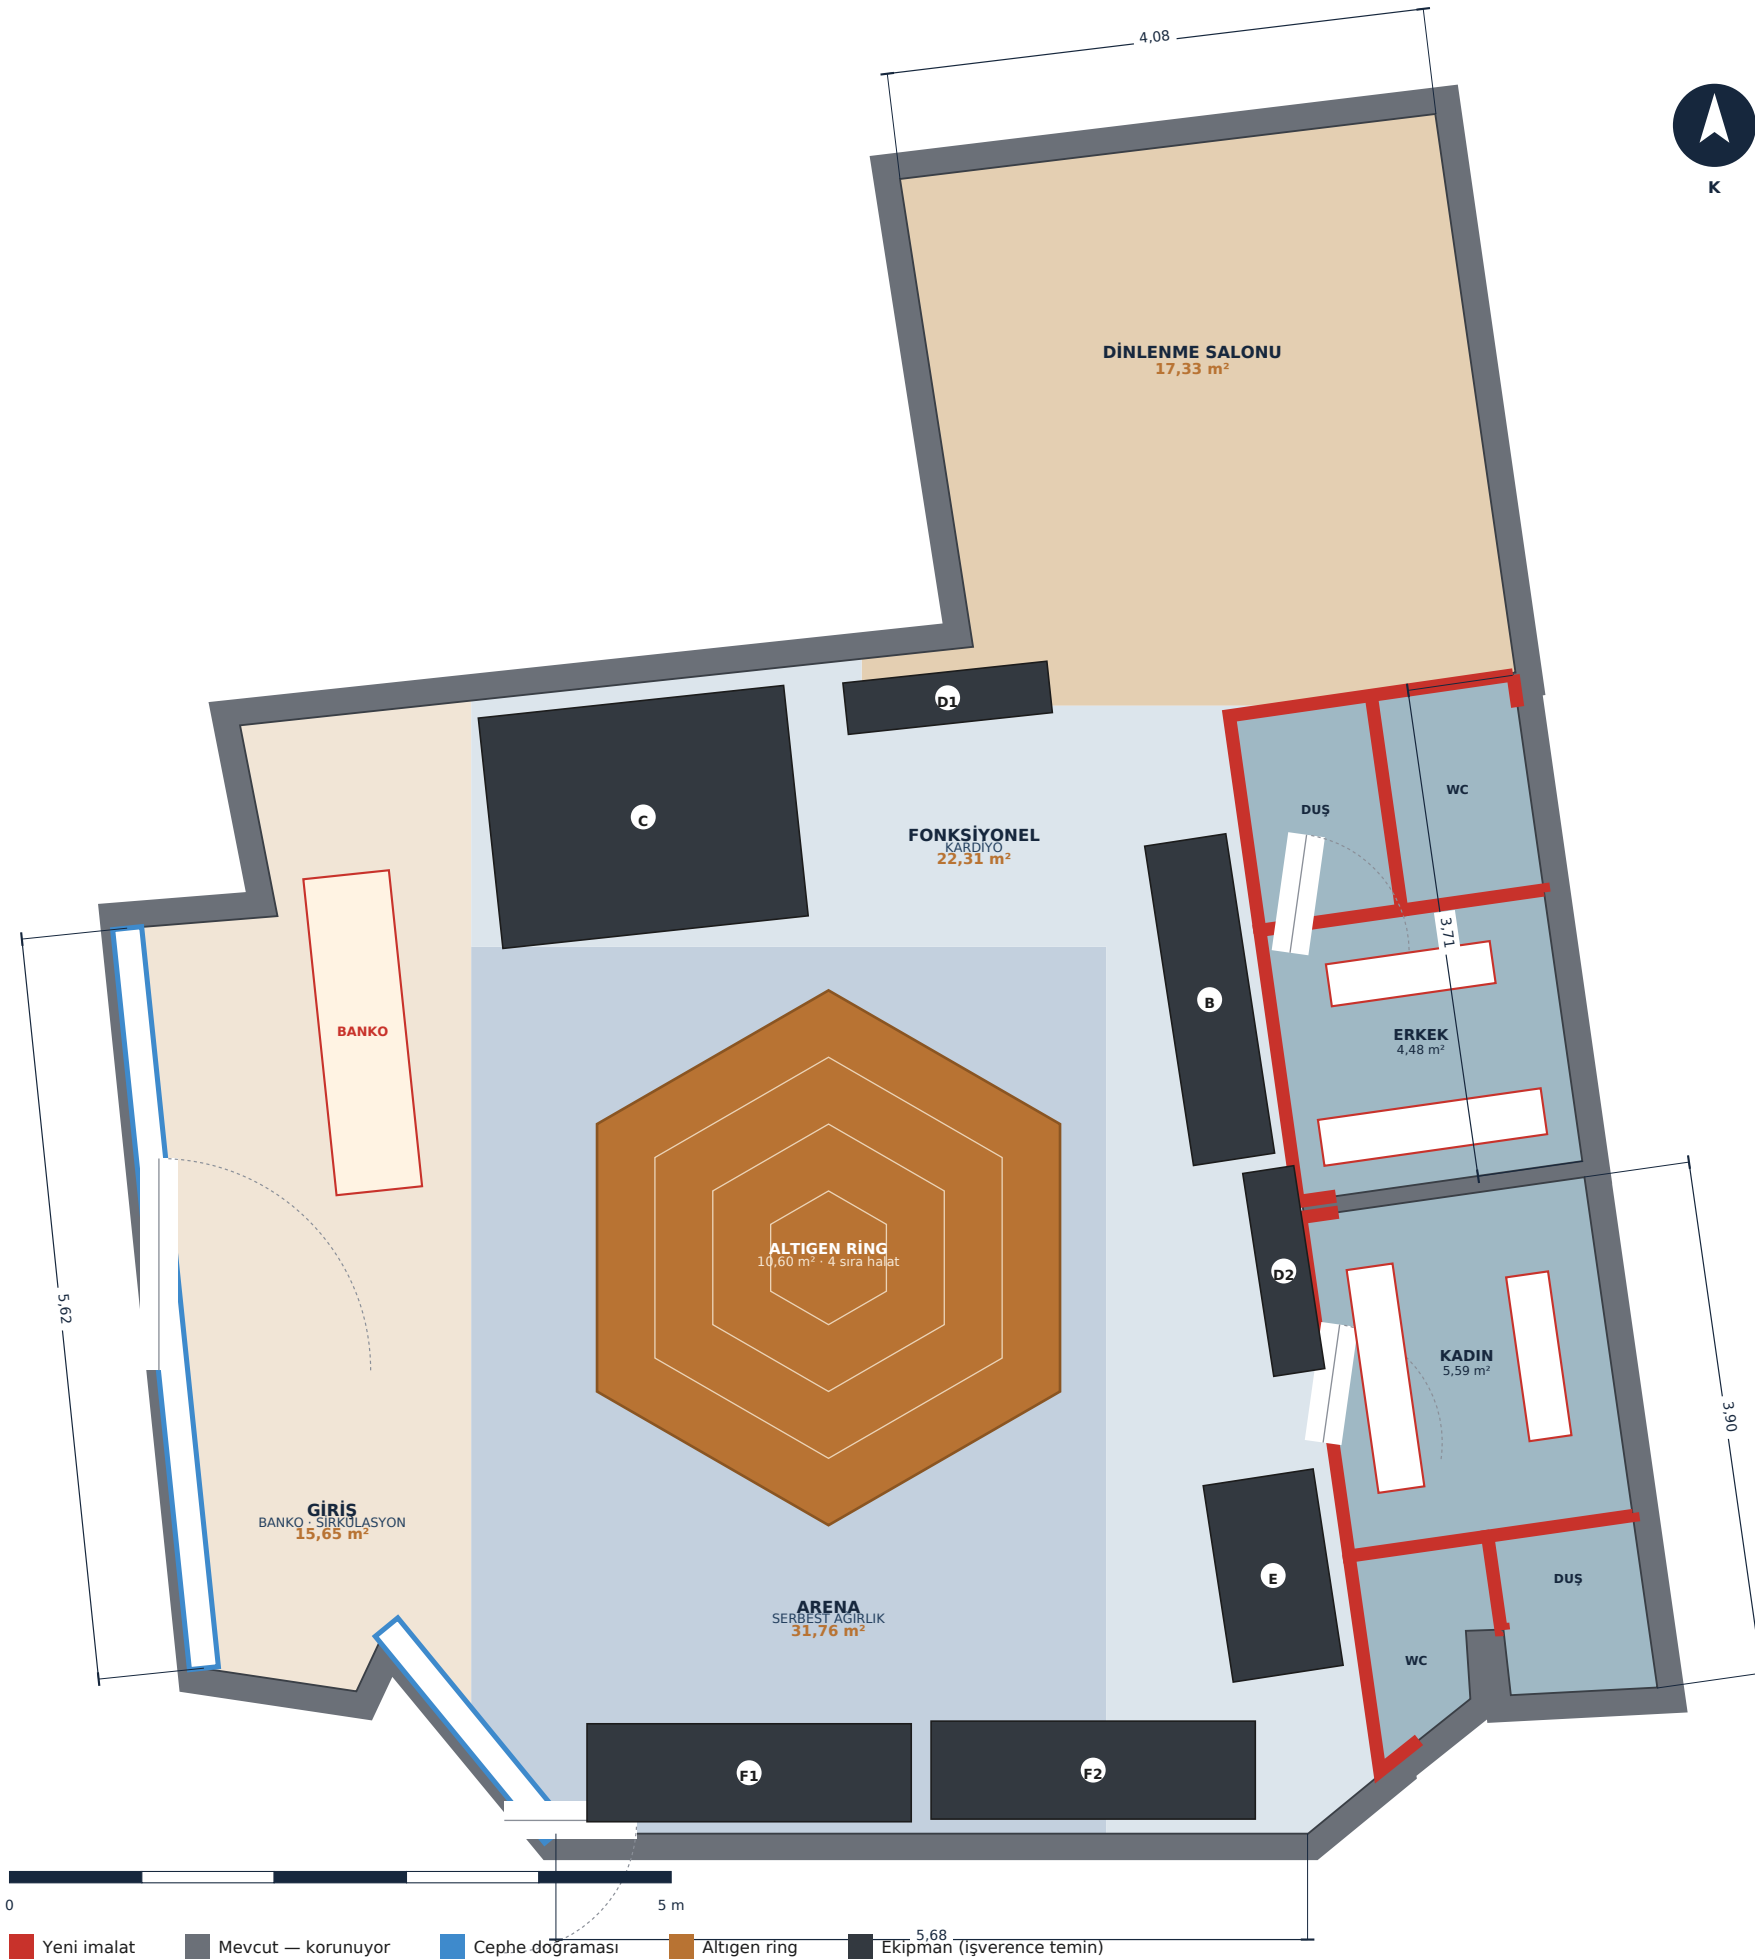

## EKİPMAN YERLEŞİMİ — mevcut ölçüler

| KOD | EKİPMAN                                            | ÖLÇÜ (CM)          | YÜK. (M) | AD. |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|----------|-----|
| A   | TRIMODE ARENA — altıgen ring, 4 sıra halat         | altıgen · 10,60 m² | 1,80     | 1   |
| B   | Çok fonksiyonlu kuvvet istasyonu (ağırlık takozlu) | 244×62             | 2,10     | 1   |
| C   | Kablo çapraz / functional trainer                  | 175×232            | 2,15     | 1   |
| D   | Dambıl rafı / sehpa                                | 155×39             | 0,95     | 2   |
| E   | Kardiyo — kondisyon bisikleti                      | 84×150             | 1,25     | 1   |
| F   | Koşu bandı                                         | 245×74             | 1,45     | 2   |

## SİRKÜLASYON VE ACİL ÇIKIŞ ANALİZİ

| ÖLÇÜT                               | DEĞER                  |
|-------------------------------------|------------------------|
| Salon brüt alanı                    | 87,05 m²               |
| Ekipman + arena footprint           | 22,27 m²               |
| Serbest sirkülasyon / çalışma alanı | 65,14 m²               |
| Eşzamanlı kapasite kabulü           | 12 kişi (≈5,4 m²/kişi) |
| Ana sirkülasyon koridoru (asgari)   | 1,20 m                 |
| Ekipman önü serbest mesafe (asgari) | 0,90 m                 |
| Ana giriş — batı cephe              | 2×80 cm çift kanat     |
| İkinci çıkış — güneybatı cephe      | 100 cm                 |
| En uzak noktadan çıkışa mesafe      | ≈ 16,5 m               |

## TASARIM KARARLARI VE GEREKÇELERİ

- MEVCUT YERLEŞİM KORUNDU. Altıgen arena merkezde, ekipman çeperde, soyunma blokları doğu cephede, banko girişte. Salon çeperinde tek bir duvar bile hareket etmiyor — bu, hem bütçeyi hem de tadilat ruhsatı riskini aşağı çekiyor.
- YENİ DUVAR YALNIZCA İKİ BLOĞUN İÇİNDE. Duş ve WC hacimlerini soyunmadan ayıran alçıpan bölmeler; toplam yeni bölme metrajı 44,6 m². Kırmızı ile gösterilmiştir.
- KUZEY KOL = DİNLENME SALONU. Yönetmeliğin aradığı 15 m² dinlenme salonu şartı 17,33 m² ile karşılanıyor; aynı bir hacim olması gürültüden uzak bir bekleme alanı da sağlıyor.
- ARENA MERKEZDE, KARDİYO GÜNEY CEPHEDE. Koşu bantları doğal ışık alan güneybatı cephesine, serbest ağırlık ise komşu duvardan uzak merkeze yerleştirildi — titreşim iletimi azalır.
- İKİ ÇIKIŞ NOKTASI. Batı cephesinden ana giriş (2×80 cm) ve güneybatı cephesinden ikinci çıkış (100 cm); en uzak noktadan çıkışa mesafe yaklaşık 16,5 m.
- BANKO GİRİŞTE, GÖRÜŞ HÂKİM. Resepsiyon bankosu hem girişi hem arenayı görür; tek personelle işletmeyi mümkün kılar.

## DOĞRULANACAK

Kolon konumları paftada net okunamamıştır; yerinde tespit sonrası ekipman yerleşimi ve keskin köşe kaplama metrajı revize edilebilir.



## ZEMİN BÖLGELERİ VE KESİT KURULUŞU

| BÖLGE                       | M²    | KAPLAMA                          | KALINLIK |
|-----------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| DİNLENME SALONU             | 17,33 | LVT / laminat parke              | 8 mm     |
| GİRİŞ · BANKO · SİRKÜLASYON | 15,65 | LVT / laminat parke              | 8 mm     |
| ARENA · SERBEST AĞIRLIK     | 31,76 | Kauçuk karo + titreşim matı      | 40+10 mm |
| FONKSİYONEL · KARDİYO       | 22,31 | Kauçuk karo                      | 20 mm    |
| ISLAK HACİM (2 blok)        | 16,73 | Seramik R11 kaymaz + su yalıtımı | —        |

## KESİT — ARENA / SERBEST AĞIRLIK ZEMİNİ



## KESİT — ISLAK HACİM ZEMİNİ (SEÇENEK A)



Seçenek B uygulanırsa hafif dolgu katmanı çıkar, kot değişmez.

## AKUSTİK VE TİTREŞİM — NEDEN AYRI KALEM

Üst katta konut bulunduğu VARSAYILMIŞTIR (yerinde doğrulanacak). Serbest ağırlık alanında ağırlık düşürme darbesi taşıyıcı döşemeden yapısal ses olarak iletilir; bu, ruhsat sonrası şikâyet ve kapatma riskinin bir numaralı kaynağıdır. Önlem: 40 mm kauçuk karonun altına 10 mm titreşim matı serilmesi (poz 04.02) ve işletme kuralı olarak ağırlık düşürmenin yasaklanması. Üstte konut olmadığı tespit edilirse poz 04.02 bütçeden çıkarılabilir.

## MALZEME SEÇİM GEREKÇELERİ

| SEÇİM                      | GEREKÇE                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kauçuk 40 mm (arena)       | 100 kg üzeri yüklerde düşürme darbesini karşılayan asgari kalınlık; ince kaplamada döşeme ve ekipman zarar görür          |
| Kauçuk 20 mm (fonksiyonel) | Ağırlık düşürülmeyen alanda yeterli; 40 mm'e göre m² maliyeti yaklaşık %40 düşük — bütçe bu ayrımla korunuyor             |
| LVT (dinlenme + giriş)     | Yönetmelik dinlenme salonu için halıfleks/parke ve benzeri istiyor; LVT ıslak temizliğe kauçuktan daha uygun ve fotojenik |
| Seramik R11 (ıslak hacim)  | Islak zeminde kaymazlık sınıfı; R10 duş önünde yetersiz kalır                                                             |


## MEKÂN PROGRAMI VE YÖNETMELİK KARŞILIĞI

| HACİM              | M²    | DONANIM                  | YÖNETMELİK KARŞILIĞI          |
|--------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| ERKEK soyunma      | 4,48  | 12 göz dolap + bank      | Dolap/askılık şartı           |
| ERKEK duş          | 1,76  | Duş teknesi + cam kabin  | Soyunma içinde duş            |
| ERKEK WC           | 1,75  | Klozet + lavabo          | Soyunma içinde tuvalet        |
| KADIN soyunma      | 5,59  | 12 göz dolap + bank      | Dolap/askılık şartı           |
| KADIN duş          | 1,39  | Duş teknesi + cam kabin  | Soyunma içinde duş            |
| KADIN WC           | 1,29  | Klozet + lavabo          | Soyunma içinde tuvalet        |
| TOPLAM ISLAK HACİM | 16,73 | 2 duş + 2 WC + 2 soyunma | Karma kullanım şartı sağlanır |

## GİDER KOTU — SEÇENEK KARŞILAŞTIRMASI

| KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ    | SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME    | SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Kalem bedeli            | 14.220 - 23.422 TL             | 72.000 - 128.000 TL                    |
| Toplam bütçeye etkisi   | 1.621.845 - 2.917.468 TL       | 1.694.271 - 3.048.557 TL               |
| Kot serbestliği         | Sınırlı — mevcut kota bağımlı  | Tam serbest                            |
| Kullanım etkisi         | 15-20 cm basamak / rampa doğar | Kot değişmez, eşiksiz                  |
| Tavan yüksekliği etkisi | Islak hacimde 15-20 cm kayıp   | Etkisi yok                             |
| Bakım / arıza riski     | Yok — mekanik parça içermez    | Var — pompa arızası kullanımı durdurur |
| Elektrik bağımlılığı    | Yok                            | Var — kesintide kullanılamaz           |
| Gürültü                 | Yok                            | Öğütücü çalışma sesi                   |
| ÖNERİ                   | TERCİH EDİLEN — kot elverirse  | Yalnız A uygulanamazsa                 |

## TESİSAT ŞEMASI — İLKE



## KRİTİK SIRA

Her iki blokta duş ve WC bitişik konumlandırılmış, tek bir düşey tesisat shaftı ve tek gider toplama hattı ile mevcut bağlantıya yönlendirilmiştir; böylece kırım ve hat uzunluğu asgaride kalır. Sıcak su, iki blok için ayrı ayrı 6 kW elektrikli ani ısıtıcı ile üretilir — yönetmeliğin 'çalışma boyunca sürekli sıcak su' şartı boiler bekleme süresi olmadan karşılanır. Binada doğalgaz bulunduğu tespit edilirse yoğunmalı kombi hem işletme gideri hem de elektrik abonelik gücü açısından daha ekonomiktir; bu durumda poz 03.07 revize edilir. SÖKÜM SONRASI İLK İŞ: mevcut pis su bağlantısının kotunun ve konumunun ölçülmesi — A/B kararı bu ölçüme bağlıdır ve zemin imalatlarının tamamını kilitler.

0 2 m

Soyunma Duş WC Yeni bölme



## AYDINLATMA — LUX HEDEFİ VE ARMATÜR ADEDİ

| BÖLGE                        | M²    | LUX | GEREKLİ LÜMEN | ARMATÜR TİPİ            | ADET |
|------------------------------|-------|-----|---------------|-------------------------|------|
| Arena / serbest ağırlık      | 31,76 | 500 | 28.357        | Lineer 40 W             | 7    |
| Fonksiyonel / kardiyo        | 22,31 | 300 | 11.951        | Lineer 40 W             | 3    |
| Dinlenme salonu              | 17,33 | 300 | 9.283         | Lineer 40 W             | 3    |
| Giriş / banko                | 15,65 | 300 | 8.383         | Lineer 40 W             | 2    |
| Soyunma + duş + WC (6 hacim) | 16,73 | 200 | 5.975         | IP44 18 W               | 6    |
| TOPLAM                       |       |     |               | 15 lineer + 6 downlight | 21   |

## HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME

| PARAMETRE                          | DEĞER                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tasarım kullanıcı sayısı           | 14 kişi (12 sporcu + 2 personel)                   |
| İç hacim (tavan 3,20 m varsayımı)  | 332,1 m³                                           |
| Taze hava debisi — tasarım         | 1.000 m³/h                                         |
| Kişi başı taze hava                | 71 m³/h-kişi (yasal asgari 30)                     |
| Hava değişim sayısı                | 3,01 h <sup>-1</sup>                               |
| Islak hacim egzozu                 | 240 m³/h (2 duş × 80 + 2 WC × 40)                  |
| Soğutma yükü — hesaplanan          | 16.672 W = 57.000 BTU/h                            |
| Klima çözümü                       | 3 × 24.000 BTU inverter split (VRF yerine — bütçe) |
| Salon ısısı — yönetmelik / tasarım | ≥18 °C / 20-22 °C                                  |

## ELEKTRİK YÜK TABLOSU

| YÜK KALEMİ                               | KW                      |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Aydınlatma (LED)                         | 0,71                    |
| Klima (split küme)                       | 5,51                    |
| Havalandırma + ıslak hacim egzozu        | 0,55                    |
| Elektrikli sıcak su (2 duş, anı ısıtıcı) | 6,00                    |
| Priz + ekipman + AV/müzik                | 3,50                    |
| TOPLAM KURULU GÜÇ                        | 16,3                    |
| TALEP GÜCÜ (eşzamanlılık 0,75)           | 12,2                    |
| ÖNERİLEN ABONELİK                        | Trifaze 3×25 A · ≥16 kW |

## DOĞRULANACAK — HESABIN TEK BİLİNMEYENİ

Mevcut pano gücü ve trifaze durumu BİLİNMEYOR. Hesaplanan 12,1 kW talep gücü mevcut abonelikte karşılanamazsa dağıtım şirketine güç artırım başvurusu yapılır; bu başvuru 3-8 hafta sürebilir ve takvime eklenmelidir. Tavan yüksekliği de varsayımdır (3,20 m): 2,80 m çıkarsa armatür adedi artar, 3,60 m çıkarsa taze hava debisi yükselir. Her iki değer de yerinde ölçüm günü netleşir.



| #  | KURUM              | YAPILACAK İŞ                                                                                                         | KİM               | SÜRE       | ÖN KOŞUL |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 0  | İşveren / avukat   | Tapu bağımsız bölüm niteliği, iskân, yönetim planı ve muvafakat durumunun tespiti                                    | İşveren           | 1-2 hafta  | —        |
| 1  | İstanbul GSİM      | Tesis fiziki şartları için YAZILI ÖN GÖRÜŞ talebi (m², soyunma ölçümü, kapsam)                                       | İşveren + müellif | 2-4 hafta  | 0        |
| 2  | Proje müellifi     | Mimar onaylı 1/100 vaziyet + yerleşim planı, tadilat projesi                                                         | Mimar             | 2-3 hafta  | 1        |
| 3  | Şantiye            | Tadilat uygulaması (söküm → tesisat → zemin → mekanik → boya → montaj)                                               | Müteahhit         | 8-11 hafta | 2        |
| 4  | İBB İtfaiye        | Yangın güvenlik önlemleri açısından işyeri denetimi ve uygunluk raporu                                               | İşveren           | 2-4 hafta  | 3        |
| 5  | İlçe Sağlık Md.    | Sağlık denetim ve onay raporu                                                                                        | İşveren           | 2-3 hafta  | 3        |
| 6  | İstanbul GSİM      | Tesis açılış izni başvurusu: dilekçe, vaziyet planı, antrenör sözleşmesi, doktor sözleşmesi, itfaiye + sağlık raporu | İşveren           | —          | 4, 5     |
| 7  | GSİM Komisyonu     | En az 5 kişilik komisyonun YERİNDE TETKİKİ ve tutanak düzenlenmesi                                                   | Komisyon          | 2-5 hafta  | 6        |
| 8  | GSİM / Valilik     | Yeterlilik belgesi, il başkanlığı / vali onayı, bir defaya mahsus TESCİL ÜCRETİ                                      | İşveren           | 1-3 hafta  | 7        |
| 9  | Maltepe Belediyesi | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu (GSİM uygunluk yazısı eki ile)                                              | İşveren           | 3-6 hafta  | 8        |
| 10 | Vergi D. / SGK     | Mükellefiyet, SGK işyeri dosyası, hijyen belgesi, personel sözleşmeleri                                              | Mali müşavir      | 1-2 hafta  | 9        |

SÜREÇTE SIK YAPILAN HATALAR

1

SIRAYI TERS KURMAK

Önce belediyeye gidilmesi. Belediye GSİM uygunluk yazısını istediği için dosya geri döner ve harç ile zaman kaybedilir. Doğru sıra: GSİM → belediye.

2

MEKÂNİ KONTROL ETMEDEN KİRALAMAK

Kaynaklarda en sık anılan hata. Tavan yüksekliği, m² ve havalandırma kontrol edilmeden sözleşme imzalanıyor. Bu projede kira imzalanmış durumda — bu yüzden 3. sayfa hazırlandı.

3

KOMİSYON TETKİKİNE ERKEN GİRMEK

Komisyon tesisi bitmiş hâlde görmek ister. Eksik tesisle yapılan tetkik olumsuz tutanakla sonuçlanır ve ikinci tur için yeniden sıra beklenir.

EVRAK KONTROL LİSTESİ

- ☐ Kimlik / şirket evrakı (imza sirküleri, ticaret sicil)
- ☐ Vergi levhası
- ☐ Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
- ☐ Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
- ☐ Bina bağımsız değilse KAT MALİKLERİ MUVAFAKATNAMESİ
- ☐ Mimar onaylı 1/100 vaziyet ve yerleşim planı
- ☐ İtfaiye yangın güvenlik uygunluk raporu
- ☐ İlçe/İl Sağlık Müdürlüğü denetim ve onay raporu
- ☐ Her spor dalı için federasyon/il onaylı antrenör sözleşmesi
- ☐ Anlaşmalı doktor / sağlık memuru / klinik sözleşmesi
- ☐ İşletmeci ders verecekse SGM onaylı antrenörlük belgesi
- ☐ GSİM tesis açılış izni ve tescil belgesi (belediye bunu ister)

| HARÇ · ÜCRET KALEMLERİ                                                                                                                |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| KALEM                                                                                                                                 | TUTAR                       |
| GSİM tesis tescil ücreti (bir defaya mahsus)                                                                                          | Genel Müdürlükçe belirlenir |
| İBB itfaiye denetim / rapor ücreti                                                                                                    | m² esaslı yıllık tarife     |
| Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı                                                                                         | Meclis tarifesi             |
| Sağlık müdürlüğü denetim / rapor                                                                                                      | Tarifeye göre               |
| Proje müellifi ve müşavirlik                                                                                                          | Sözleşmeye göre             |
| Tutarlar her yıl güncellenir; başvuru öncesi ilgili kurumdan teyit alınmalıdır. Nakit planında 85.000-175.000 TL bandı öngörülmüştür. |                             |


Toplam ruhsat zinciri tahmini 16-28 hafta. Tadilat (adım 3) ile evrak süreçlerinin paralel yürütülmesi bu süreyi kısaltır; ancak adım 1 tamamlanmadan imalata başlanması, tescil reddi hâlinde yapılan tüm harcamayı riske atar.

| MALİYET BAŞLIĞI              | DÜŞÜK (TL) | YÜKSEK (TL) | PAY  |
|------------------------------|------------|-------------|------|
| YIKIM · SÖKÜM                | 80.021     | 145.283     | %6   |
| DUVAR · ALÇIPAN              | 69.432     | 114.946     | %5   |
| ISLAK HACİM                  | 254.777    | 443.647     | %19  |
| ZEMİN                        | 91.248     | 151.406     | %7   |
| ELEKTRİK                     | 206.100    | 382.500     | %16  |
| MEKANİK                      | 204.000    | 353.000     | %15  |
| BOYA · DEKOR                 | 82.175     | 155.676     | %7   |
| MARANGOZ                     | 118.000    | 212.400     | %9   |
| YANGIN · GÜVENLİK            | 114.100    | 223.600     | %9   |
| TABELA · DIŞ                 | 74.000     | 145.000     | %6   |
| İMALAT ARA TOPLAMI           | 1.293.853  | 2.327.458   | %100 |
| Şantiye genel giderleri (%9) | 116.447    | 209.471     |      |
| Beklenmedik giderler (%15)   | 211.545    | 380.539     |      |
| GENEL TOPLAM — ÖNERİLEN      | 1.621.845  | 2.917.468   |      |

SENARYO KARŞILAŞTIRMASI

| SENARYO                                            | DÜŞÜK (TL) | YÜKSEK (TL) | TL/M²         |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| MİNİMUM — yalnız zorunlu kalemler                  | 1.371.611  | 2.428.835   | 13.217-23.404 |
| ÖNERİLEN — akustik, ayna, zayıf akım, tabela dâhil | 1.621.845  | 2.917.468   | 15.628-28.112 |
| ÖNERİLEN + Seçenek B (pompa)                       | 1.694.271  | 3.048.557   | 16.326-29.375 |

MALİYET DAĞILIMI — BAŞLIK BAZINDA BANT

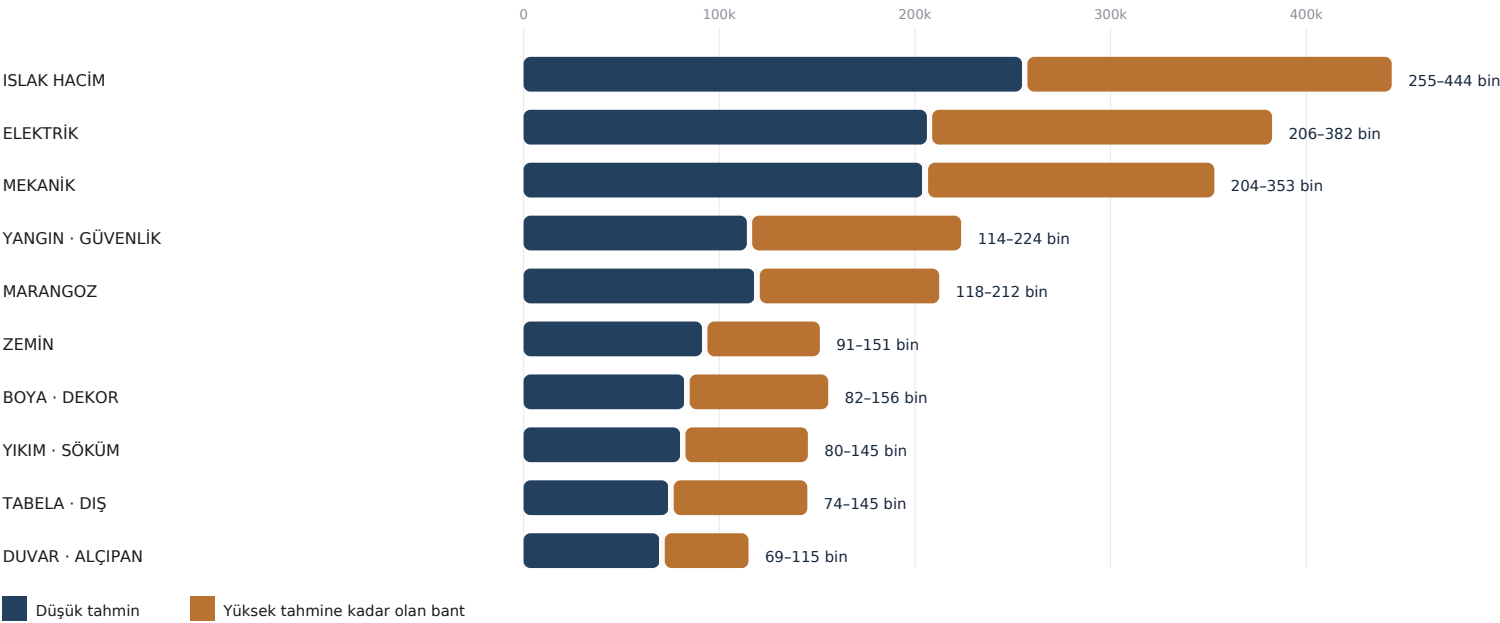

TL/M² NEDEN YÜKSEK GÖRÜNÜYOR?

2026 İstanbul konut yenilemesi için sıkça anılan 5.500-8.500 TL/m² çıpası bu projeye doğrudan uygulanamaz. Birinci neden: bu bir ticari dönüşümdür — ıslak hacmin komple yenilenmesi, mekanik havalandırma, yangın algılama, engelli düzenlemesi ve spor zemini konut yenilemesinde bulunmayan kalemlerdir. İkinci ve daha belirleyici neden ölçek: pano, yangın algılama, havalandırma seti, tabela ve tesisat gibi götürü kalemler alandan büyük ölçüde bağımsızdır ve bu 103,78 m²'lik birimde imalat bedelinin yaklaşık %40'ını oluşturur. Aynı işler 250 m²'lik bir birimde yapılsaydı TL/m² yarıya inerdi. Bu nedenle tek m² fiyatı kullanılmamış, 46 poz kalem bazlı kurulmuştur.

AÇILIŞ ÖNCESİ NAKİT İHTİYACI

| KALEM                                                  | DÜŞÜK (TL) | YÜKSEK (TL) |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Tadilat (önerilen senaryo, Seçenek A)                  | 1.621.845  | 2.917.468   |
| Ruhsat · harç · GSİM tescil · itfaiye · sağlık raporu  | 85.000     | 175.000     |
| Proje / mimari onaylı 1/100 vaziyet planı · müşavirlik | 45.000     | 95.000      |
| İlk 3 ay kira                                          | 84.000     | 156.000     |
| Depozito (3 ay)                                        | 84.000     | 156.000     |
| Personel (açılış öncesi 2 ay · 2 kişi)                 | 160.000    | 280.000     |
| Pazarlama · açılış kampanyası · dijital                | 95.000     | 210.000     |
| Yazılım (üyelik/POS), sarf, ilk stok                   | 55.000     | 120.000     |
| TOPLAM AÇILIŞ ÖNCESİ NAKİT                             | 2.229.845  | 4.109.468   |


KARŞILAŞTIRMA ÇIPALARI (kendi hesabın yerine geçmez)

| REFERANS                                        | TUTAR                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Butik salon başlangıç bütçesi — 2026 kaynakları | 500.000 – 1.000.000 TL                   |
| Orta ölçekli salon — 2026 kaynakları            | 1.500.000 – 3.000.000 TL (ekipman dâhil) |
| Bu projenin tadilat bandı (önerilen)            | 1.621.845 – 2.917.468 TL                 |
| Bu projenin açılış öncesi toplam nakdi          | 2.229.845 – 4.109.468 TL                 |

EKİPMAN — BÜTÇE DIŞI

TRIMODE arena ve tüm antrenman ekipmanı işverence temin edilmiştir; bu dosyadaki hiçbir maliyet kaleminde yer almaz. Ekipman yerleşimi mevcut ölçüler (244×62, 175×232, 155×39 ×2, 84×150, 245×74 ×2 cm ve 10,60 m² altıgen arena) üzerinden çözülmüştür. Marka/model listesi işverenden alındığında BoQ'nun 3. sayfasına bilgi amaçlı işlenmelidir. Nakliye, montaj ve devreye alma bedelleri tedarikçi kapsamında değilse ayrıca bütçelenmelidir.

## UYGULAMA SIRASI

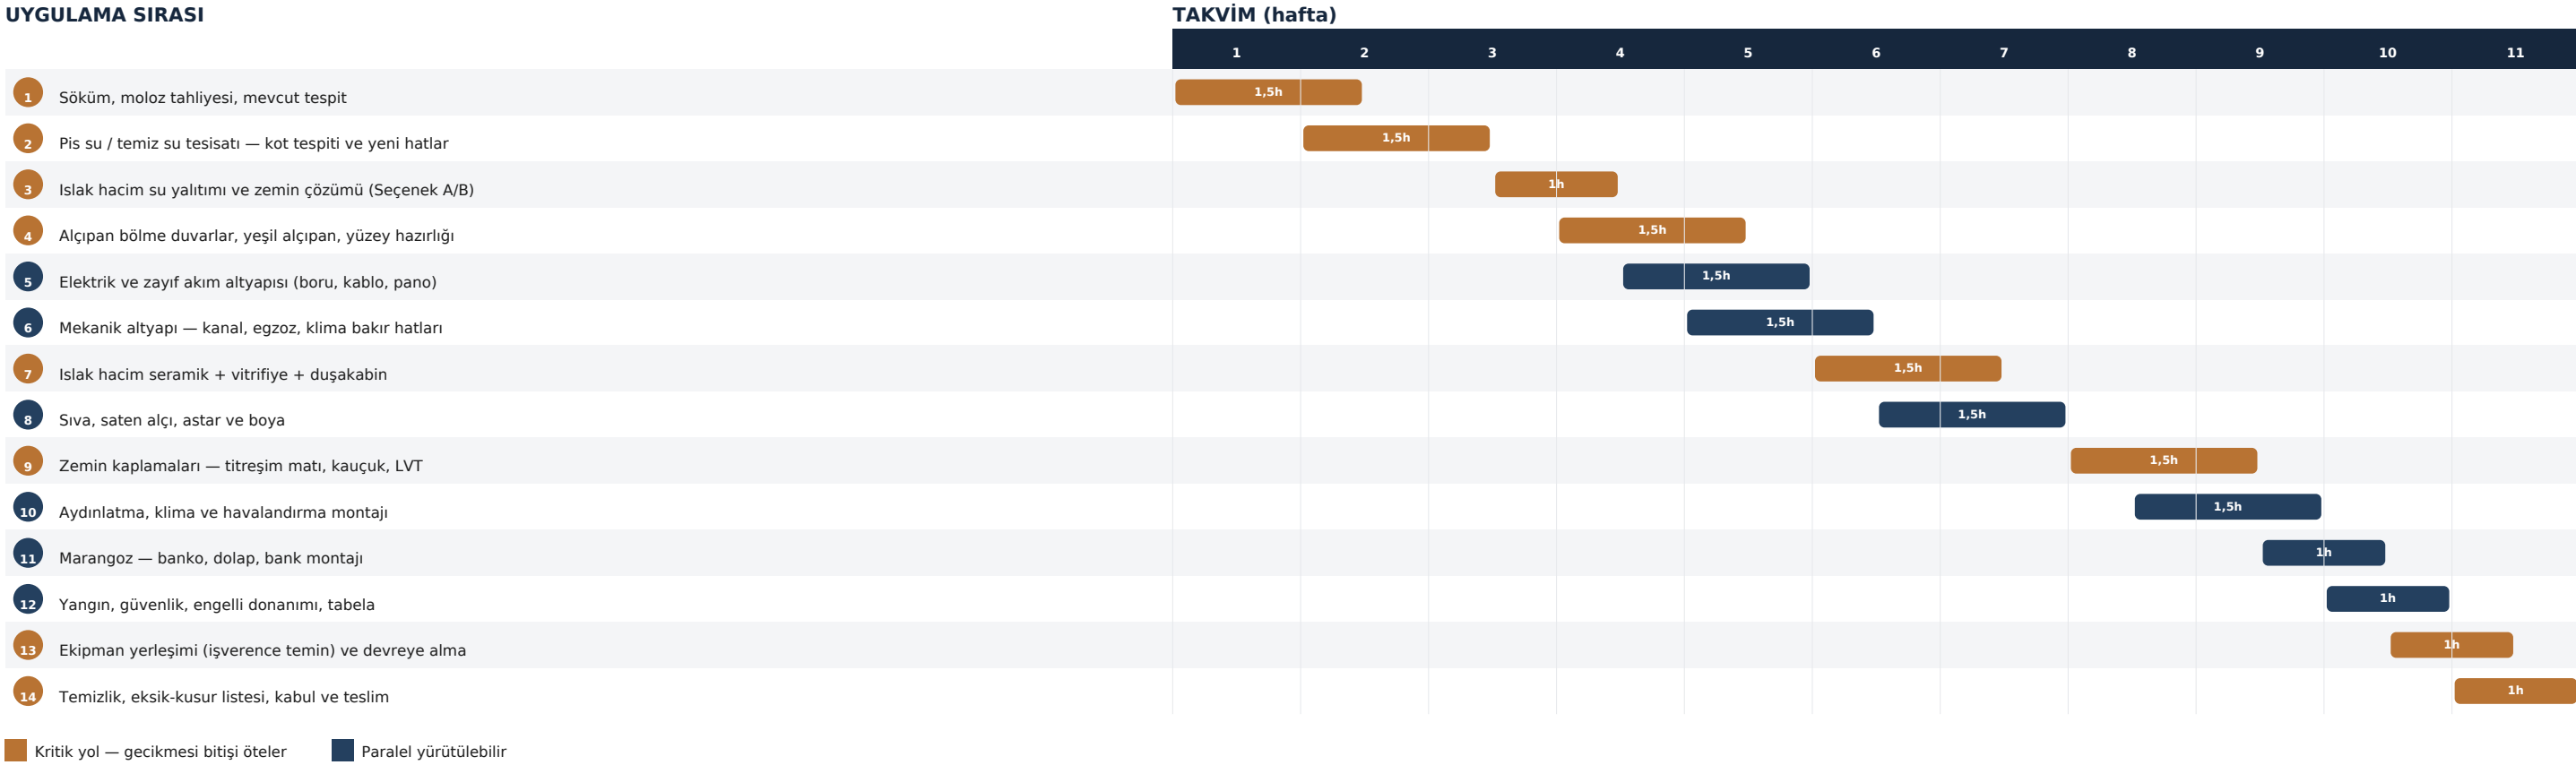

## 1 SIRAYI BELİRLEYEN KURAL

Islak hacim tesisatı ve gider kotu çözülmeden hiçbir zemin imalatına başlanamaz. Söküm biter bitmez kot ölçülür; Seçenek A/B kararı 2. haftada verilmelidir. Zemin kaplaması (adım 9) en sona bırakılır — kauçuk ve LVT, boya ve montaj sırasında zarar görmemelidir.

## 2 PARALEL YÜRÜTÜLECEK EVRAK

Tadilat sürerken itfaiye ve sağlık başvuruları hazırlanır, antrenör ve doktor sözleşmeleri imzalanır, mimar onaylı vaziyet planı tamamlanır. GSİM komisyonu ancak tesis bitmiş hâlde tetkik ettiğinden, başvuru 13. adımdan önce yapılmamalıdır.

## 3 KABUL VE TESLİM

Son hafta: eksik-kusur (punch) listesi, tesisat basınç testi, elektrik topraklama ölçümü, havalandırma debi ölçümü, aydınlatma lux ölçümü ve tüm garanti belgelerinin teslimi. Bu ölçüm tutanakları GSİM komisyon tetkikinde işverenin lehine kanıttır.

## KABUL KRİTERLERİ — son hafta tutanakla belgelenecek ölçümler

| BAŞLIK       | ÖLÇÜM / KABUL KRİTERİ                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tesisat      | Temiz su hattı basınç testi · pis su akış ve sızdırmazlık kontrolü                       |
| Elektrik     | Topraklama direnci ölçümü · kaçak akım rölesi testi · pano etiketleme                    |
| Havalandırma | Menfez debi ölçümü — tasarım 1.000 m³/h taze hava, 240 m³/h ıslak hacim egzozu           |
| Aydınlatma   | Lux ölçümü — arena 500, çalışma alanı 300, soyunma 200, ıslak hacim 150 lux              |
| Zemin        | Kauçuk karo ek yerleri · titreşim matı sürekliliği · ıslak hacim eğim ve süzgeç kontrolü |
| Yangın       | Söndürücü yerleşimi ve etiketleri · algılama paneli devreye alma · acil aydınlatma testi |

| RİSK                                                                        | OLASILIK | ETKİ       | ÖNLEM                                                                                                                                                                                                                                                   | SAHİP     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GSİM'in 125 m² / 170 m² uygulamasını bu tesise de uygulaması → tescil reddi | Yüksek   | Çok yüksek | Adım 1'deki yazılı ön görüş; reddi hâlinde tescil kapsamının randevulu kişisel antrenman stüdyosu olarak daraltılması; kira sözleşmesindeki fesih/indirim imkânının avukatla değerlendirilmesi. Bahçe kapatma seçeneği işveren kararıyla kapsam dışıdır | İşveren   |
| Kat malikleri muvafakatnamesi alınamaması → belediye ruhsatı çıkmaz         | Orta     | Çok yüksek | Yönetim planının hemen incelenmesi; komşularla erken temas; gürültü önlemlerinin (titreşim matı) muvafakat görüşmesinde argüman olarak kullanılması                                                                                                     | İşveren   |
| Pis su kotunun yerçekimiyle çözülememesi                                    | Orta     | Orta       | Seçenek A (zemin yükseltme, +%2-4 bütçe) hazır; olmazsa Seçenek B pompa. Söküm sonrası ilk iş kot tespiti                                                                                                                                               | Müteahhit |
| Tavan yüksekliğinin 2,50 m altında çıkması                                  | Düşük    | Yüksek     | Yerinde ölçüm ilk hafta. Asma tavan adası iptal edilir, açık tavan endüstriyel çözüme geçilir                                                                                                                                                           | Mimar     |
| GSİM komisyon tetkikinde eksik tespiti → ikinci tur                         | Orta     | Orta       | Tetkik öncesi bu dosyanın uygunluk sayfasının madde madde kapatılması; eksik evrakın önceden tamamlanması                                                                                                                                               | İşveren   |
| Islak hacim kaynaklı bütçe saptması                                         | Yüksek   | Orta       | %15 beklenmedik payı bütçede ayrıldı; sökümden sonra keşif revizyonu ve BoQ'nun güncellenmesi                                                                                                                                                           | Müteahhit |
| Üst kat gürültü şikâyeti → ruhsat sonrası kapatma riski                     | Orta     | Yüksek     | Arena altına 40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı; ağırlık düşürmenin kural olarak yasaklanması; çalışma saatlerinin sınırlandırılması                                                                                                                    | İşletme   |
| Takvim saptması — ruhsat zinciri uzarsa boş kira yükü                       | Yüksek   | Orta       | Tadilat ile evrak süreçlerinin paralel yürütülmesi; ilk 3 ay kira nakit planına alındı                                                                                                                                                                  | İşveren   |

RİSK MATRİSİ

|        |            | OLASILIK → |      |        |
|--------|------------|------------|------|--------|
|        |            | DÜŞÜK      | ORTA | YÜKSEK |
| ETKİ ↑ | ORTA       |            | 2    | 2      |
|        | YÜKSEK     | 1          | 1    |        |
|        | ÇOK YÜKSEK |            | 1    | 1      |

8 risk kaydı

- Yüksek olasılık × çok yüksek etki hücreesindeki tek risk, 125/170 m² uygulamasıdır — bu yüzden yatırımın ilk adımı yazılı ön görüştür.
- Matristeki risklerin yarısı veri eksikliğinden kaynaklanıyor; yerinde ölçüm günü matrisin sol-üst köşesini büyük ölçüde boşaltır.

RENDER PROMPT SETİ VE 3D MODEL

Bu dosyanın eki olarak: (a) plana sadık Three.js kütle modelinden alınmış dört sabit kamera açısı, (b) bu görsellerin image-to-image yöntemiyle fotogerçekleştirilmiş iki stil varyantı (ham endüstriyel / sıcak minimal), (c) tek dosya offline Gym\_Model.html (WhatsApp'tan paylaşılabilir, render galerisi gömülü) ve (d) Render\_Promptlari.md üretilmiştir. İşverenden mevcut durum fotoğrafları geldiğinde aynı kamera açılarıyla gerçek ÖNCE/SONRA çiftleri üretilebilir — bu, kredi ve ortak görüşmelerinde en ikna edici çıktıdır. Tüm görseller temsildir; imalat ölçüsü değildir.

SONRAKİ 5 ADIM

1 YERİNDE ÖLÇÜM GÜNÜ

Tavan yüksekliği, pis su kotu ve konumu, elektrik pano gücü/trifaze, kolon konumları, mevcut durum fotoğrafları. Yarım gün, maliyeti yok, her şeyin girdisi.

2 TAPU · İSKÂN · YÖNETİM PLANI DOSYASI

Bağımsız bölüm niteliği ve muvafakat gerekliliği netleşmeden hiçbir imalata başlanmamalı.

3 İSTANBUL GSİM'E YAZILI ÖN GÖRÜŞ BAŞVURUSU

Bu projenin tek kritik belirsizliği. Dilekçe ekine bu dosyanın 3. ve 5. sayfası konulabilir.

4 PROJE MÜELLİFİ (MİMAR) TAYİNİ

1/100 onaylı vaziyet planı olmadan ne GSİM ne belediye dosyası açılabilir.

5 BOQ İLE 3 MÜTEAHHİTTEN TEKLİF

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası hazır; teklifler aynı metraj üzerinden karşılaştırılabilir.

İŞVERENDEN İSTENECEK BİLGİ

- DXF export (AutoCAD R2010)
- Mevcut durum fotoğrafları (salon, giriş, soyunma)
- Ölçülmüş net m² ve tavan yüksekliği
- Satın alınan ekipman listesi (marka/model/ölçü/ağırlık)
- Pis su bağlantısı fotoğrafı ve kotu
- Elektrik pano gücü ve trifaze durumu
- Tapu bağımsız bölüm niteliği ve iskân
- Bina bağımsız mı; değilse yönetim planı
- Hedeflenen açılış tarihi ve üye kapasitesi
