

ÖN TASARIM VE YATIRIM DOSYASI

# MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

MALTEPE / İDEALTEPE · İSTANBUL

103,78 m<sup>2</sup> net iç alan · Rev C · 13 Eylül 2026



# Altı rakamda proje

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

## NET İÇ ALAN

# 103,78 m<sup>2</sup>

salon 87,05 + ıslak hacim 16,73

## EŞZAMANLI KAPASİTE

# 12 kişi

65,14 m<sup>2</sup> serbest sirkülasyon · ≈5,4 m<sup>2</sup>/kişi

## TADİLAT BÜTÇESİ

# 1,96-3,40 M₺

önerilen senaryo · Eylül 2026 piyasa mertebesi

## RUHSAT ZİNCİRİ

# 16-28 hafta

GSİM ön görüşten belediye ruhsatına

## ŞANTIYE SÜRESİ


# 11 hafta

14 adım · kritik yol ıslak hacim

## EKİPMAN

# Bütçe dışı

işverence temin edilmiştir

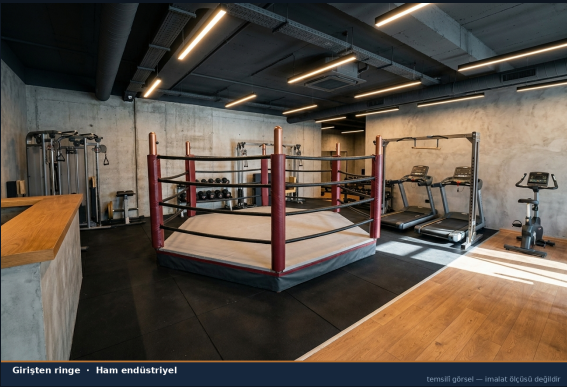

Girişten ringe · Ham endüstriyel

temsilî görsel — inşaat ölçüsü değildir

## BU DOSYADA NE VAR

- A3 ana dosya — 12 sayfa tasarım, mevzuat, yol haritası ve maliyet
- BoQ (.xlsx) — 106 poz, birim fiyat sütunları boş, formüller canlı
- 8 fotogerçekçi render — 4 açı × 2 stil varyantı
- Gym\_Model.html — tek dosya offline 3B model, WhatsApp'tan paylaşılabilir
- Render\_Promptlari.md — harici modelde yeniden üretim için

# Mevzuat eşiği — projenin tek kritik belirsizliği

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

## UYGULAMADA ARANAN

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Çalışma (salon) alanı     | $\geq 125 \text{ m}^2$                   |
| Kadın soyunma             | $\geq 15 \text{ m}^2$                    |
| Erkek soyunma             | $\geq 15 \text{ m}^2$                    |
| Dinlenme salonu           | $\geq 15 \text{ m}^2$                    |
| <b>TOPLAM TESİS ALANI</b> | <b><math>\geq 170 \text{ m}^2</math></b> |
| Tavan yüksekliği          | $\geq 2,50 \text{ m}$                    |

## BU BİRİMDE VAR OLAN

# 103,78 m<sup>2</sup>

net iç kullanım alanı

- Bahçeler kapatılmayacak — açık kullanımda kalır, alan hesabına girmez.
- Yönetmelik METNİ salon için m<sup>2</sup> şartı getirmiyor: soyunma  $\geq 8 \text{ m}^2$  ve dinlenme  $\geq 15 \text{ m}^2$  diyor.
- Bu iki şart mevcut planda sağlanıyor (8,24 / 8,49 ve 17,33 m<sup>2</sup>).
- Karar teknik değil İDARİ. Tek yol: İstanbul GSİM'den YAZILI ÖN GÖRÜŞ.

# Ön görüşün üç olası sonucu, üç rota

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

## R1 ÖN GÖRÜŞ OLUMLU

- Mevcut alan yeterli görülür
- Bu dosya olduğu gibi uygulanır
- Ek maliyet yok
- Tadilat hemen başlar
- EN HIZLI SENARYO

## R2 KAPSAM REVİZYONU


- Randevulu kişisel antrenman stüdyosu
- Ring bire bir çalışmaya zaten uygun
- GSİM tescil kapsamı daraltılır
- Belediye NACE kodu buna göre
- HUKUKİ GÖRÜŞ ŞART

## R3 SÖZLEŞME YOLU

- Mesele mimari değil, ticarî
- Kira sözleşmesinde fesih / indirim
- Avukatla değerlendirme
- Gerekirse mal sahibiyle müzakere
- Geciktikçe manevra alanı daralır

# Alan dağılımı — tüm hesapların temeli

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

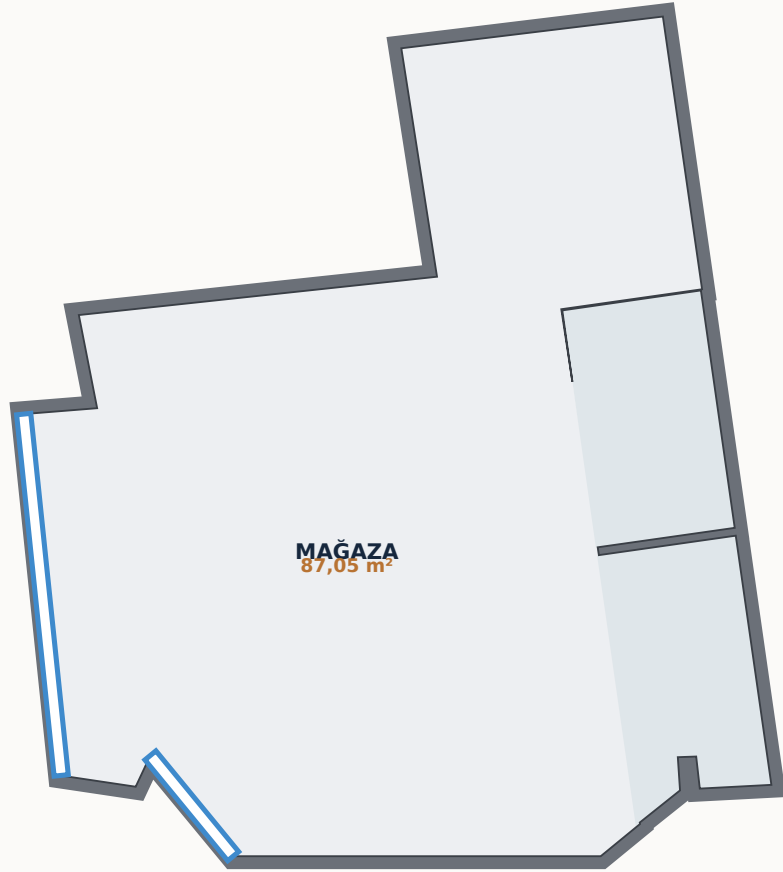


| BÖLÜM                    | M²     |
|--------------------------|--------|
| Salon (açık satış alanı) | 87,05  |
| Erkek soyunma bloğu      | 8,24   |
| Kadın soyunma bloğu      | 8,49   |
| NET İÇ KULLANIM ALANI    | 103,78 |
| Ön bahçe (açık)          | 24,39  |
| Arka bahçe (açık)        | 32,82  |

## ÖLÇÜ DAYANAĞI

DWG dosyası AutoCAD 2018 formatında ve bu ortamda açılmadı; PDF paftaları vektör değil raster. Geometri renk alanları izlenerek vektörleştirildi ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edildi — sapma %3'ün altında. Uygulama projesi için DXF (R2010) istenmelidir.

# Yerleşim korunur, duvar hareketi asgaride

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

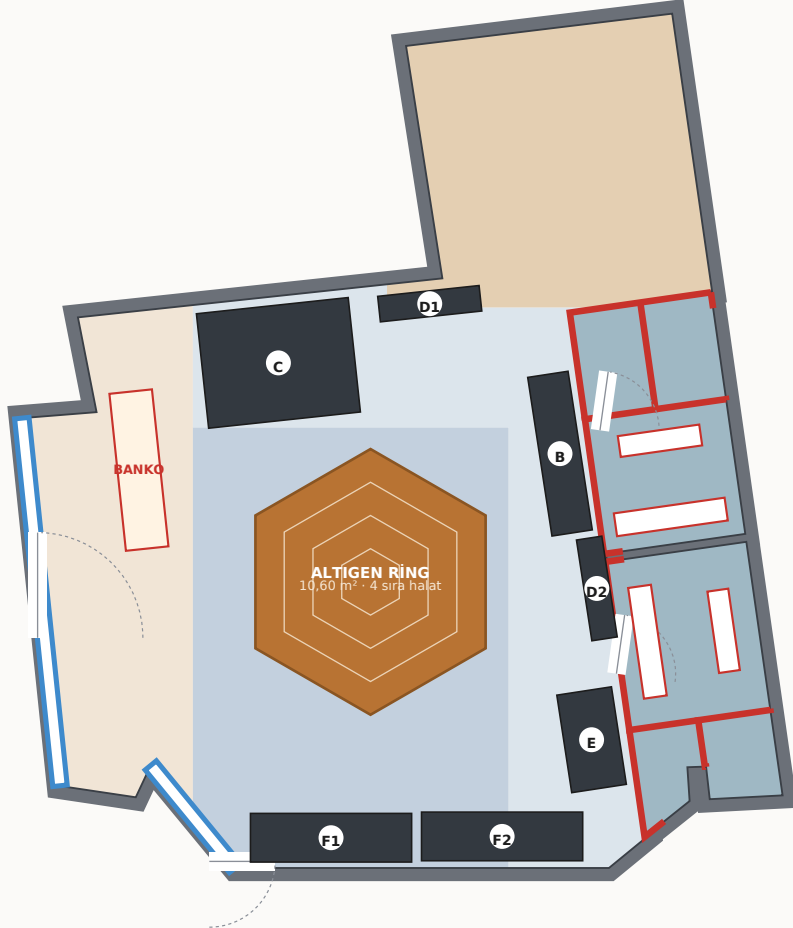

## ARENA · SERBEST AĞIRLIK

31,76 m<sup>2</sup>

40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı

## FONKSİYONEL · KARDİYO

22,31 m<sup>2</sup>

20 mm kauçuk karo

## DİNLENME SALONU

17,33 m<sup>2</sup>LVT — yönetmelik şartı 15 m<sup>2</sup>

## GİRİŞ · BANKO

15,65 m<sup>2</sup>

LVT · resepsiyon 2,40 m

## ISLAK HACİM (2 blok)

16,73 m<sup>2</sup>


2 duş + 2 WC · R11 seramik

### YENİ İMALAT NEREDE?

Kırmızı ile gösterilen tek yeni duvar imalatı, iki soyunma bloğunun içinde duş ve WC hacimlerini ayıran alçıpan bölmelerdir. Salon çerperinde hiçbir duvar hareket etmiyor.

# Üç bölge — para nereye harcanıyor

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

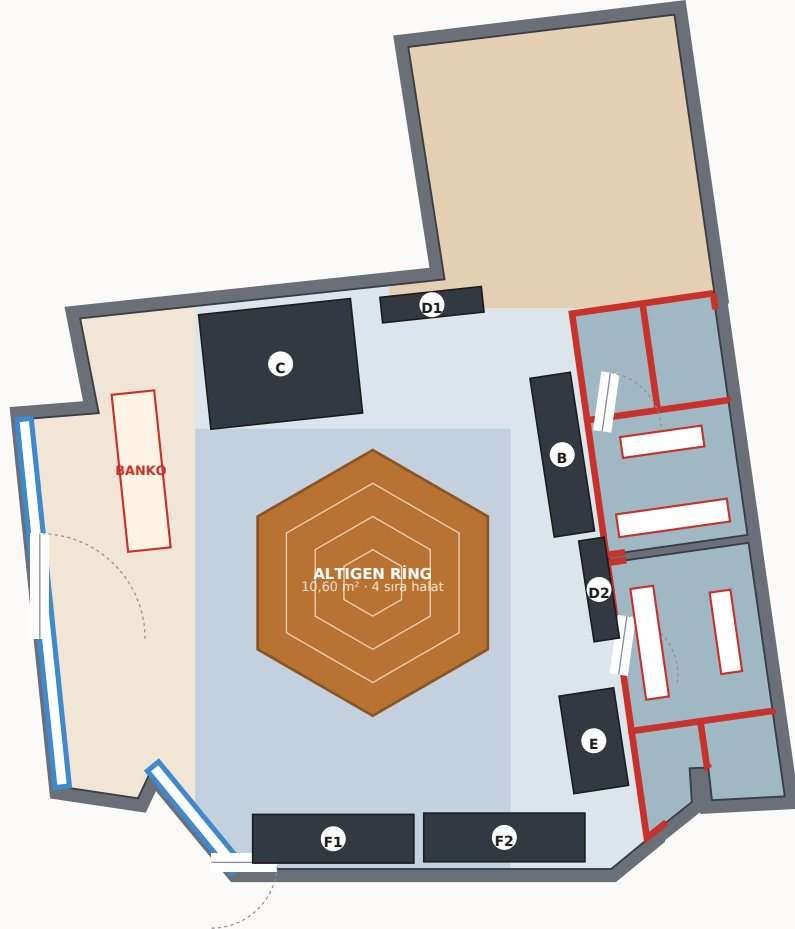

## DİNLENME SALONU

17,33 m² · 8 mm

Yönetmelik dinlenme salonu için halıfleks/parke ve benzeri istiyor

## GİRİŞ

15,65 m² · 8 mm

Resepsiyon ve bekleme — ıslak temizliğe uygun, fotojenik

## ARENA

31,76 m² · 40+10 mm

100 kg üzeri düşürmede asgari kalınlık; altında titreşim matı

## FONKSİYONEL

22,31 m² · 20 mm

Ağırlık düşürülmeyen alan — m² maliyeti %40 daha düşük

## ISLAK HACİM

16,73 m² · R11 kaymaz


Duş önünde R10 yetersiz kalır; su yalıtımı 30 cm dönüşü

### AKUSTİK — RUHSAT SONRASI EN BÜYÜK RİSK

Üst katta konut bulunduğu varsayılmıştır. Ağırlık düşürme darbesi döşemeden yapısal ses olarak iletilir ve şikâyet → kapatma riski doğurur. Arena altına 10 mm titreşim matı serilir ve işletme kuralı olarak ağırlık düşürme yasaklanır.

# Maliyetin kalbi — ve tek bilinmeyeni

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

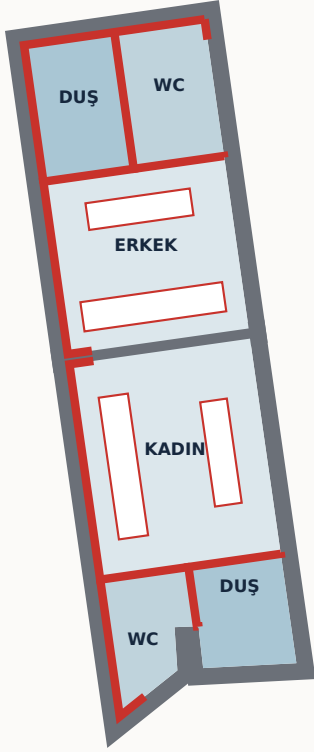

| ÖLÇÜT                | SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME | SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI      |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Kalem bedeli         | 14.220 - 23.422 TL          | 72.000 - 128.000 TL              |
| Kot serbestliği      | Mevcut kota bağımlı         | Tam serbest                      |
| Kullanım etkisi      | 15-20 cm basamak doğar      | Kot değişmez, eşiksiz            |
| Bakım / arıza riski  | Yok                         | Pompa arızası kullanımı durdurur |
| Elektrik bağımlılığı | Yok                         | Var — kesintide kullanılamaz     |
| ÖNERİ                | TERCİH EDİLEN               | Yalnız A uygulanamazsa           |

## SÖKÜM SONRASI İLK İŞ

Mevcut pis su bağlantısının kötü ve konumu BİLİNİYOR. Bu tek ölçüm, A/B kararını ve dolayısıyla tüm zemin imalatlarının sırasını kilitler. Yönetmelik şartı olan 2 duş + 2 WC her iki seçenekte de sağlanır.

# Kapasite hesabı — kişi başı debiden başlayarak

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

## TAZE HAVA

**1.000 m<sup>3</sup>/h**71 m<sup>3</sup>/h-kişi · yasal asgari 30

## HAVA DEĞİŞİMİ

**3,01 h<sup>-1</sup>**iç hacim 332,1 m<sup>3</sup>

## SOĞUTMA

**57.000 BTU**

4 bölge · 66.000 BTU kurulu

## TALEP GÜCÜ

**17,0 kW**

trifaze 3×25 A abonelik önerilir


| AYDINLATMA BÖLGESİ           | M <sup>2</sup> | LUX HEDEFİ | ARMATÜR TİPİ            | ADET |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------------|------|
| Arena / serbest ağırlık      | 31,76          | 500        | Lineer 40 W             | 7    |
| Fonksiyonel / kardiyo        | 22,31          | 300        | Lineer 40 W             | 3    |
| Dinlenme salonu              | 17,33          | 300        | Lineer 40 W             | 3    |
| Giriş / banko                | 15,65          | 300        | Lineer 40 W             | 2    |
| Soyunma + duş + WC (6 hacim) | 16,73          | 200        | IP44 18 W               | 6    |
| TOPLAM                       |                |            | 15 lineer + 6 downlight | 21   |

### DOĞRULANACAK

Mevcut pano gücü ve trifaze durumu bilinmiyor. 12,1 kW talep gücü karşılanamazsa dağıtım şirketine güç artırım başvurusu gerekir — 3-8 hafta. Tavan yüksekliği de varsayım (3,20 m); değişirse armatür adedi ve taze hava debisi yeniden hesaplanır.

# Sıra kritik: önce GSİM, sonra belediye

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C



## TOPLAM 16-28 HAFTA

Ön görüşten belediye ruhsatına kadar. Tadilat ile evrak süreçleri paralel yürütülerek kısaltılabilir.

## KOMİSYON YERİNDE GELİR


En az 5 kişilik komisyon tesisi bitmiş hâlde tetkik eder ve tutanak düzenler. Eksik tesisle başvuru ikinci tur demektir.

## EN SIK HATA

Belediyeye önce gitmek. Belediye GSİM uygunluk yazısını istediği için dosya geri döner; harç ve zaman kaybedilir.

# 106 poz · kalem bazlı · düşük-yüksek bant

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

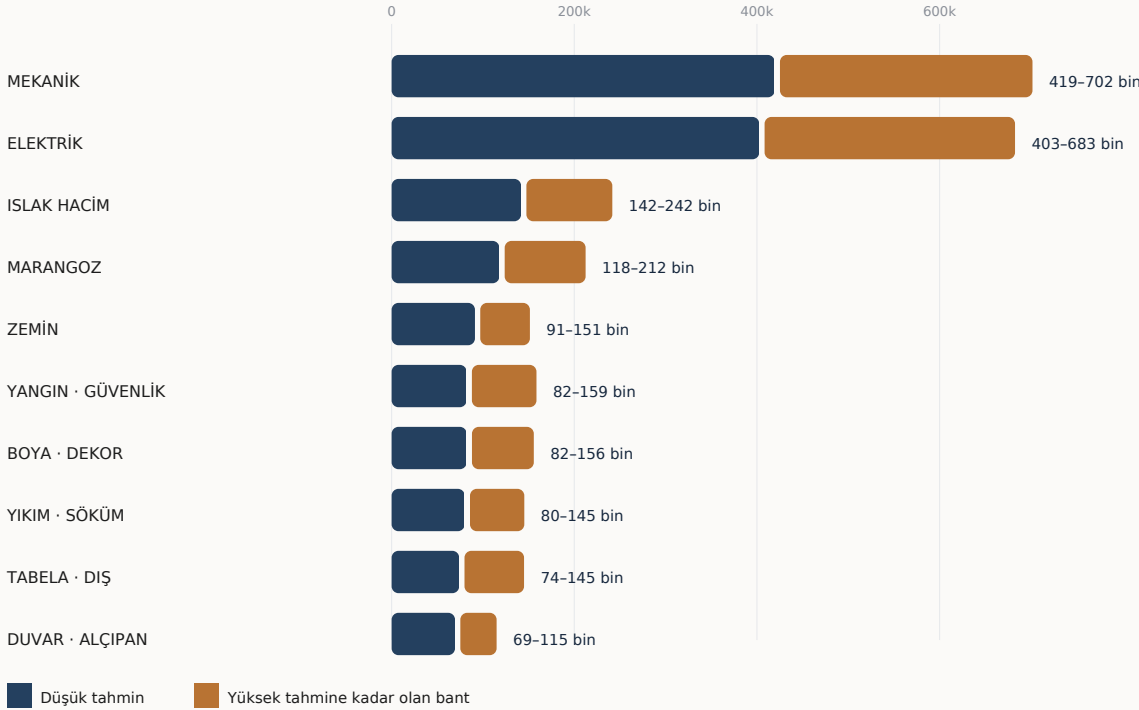

| SENARYO                                   | DÜŞÜK (TL) | YÜKSEK (TL) |
|-------------------------------------------|------------|-------------|
| MİNİMUM — yalnız zorunlu                  | 1.775.116  | 3.045.316   |
| ÖNERİLEN — akustik, ayna, tabela dâhil    | 1.956.408  | 3.396.065   |
| Şantiye genel gideri %9 + beklenmedik %15 | dâhil      | dâhil       |

## AÇILIŞ ÖNCESİ TOPLAM NAKİT

# 2,56-4,59 M₺

tadilat + ruhsat/harç + 3 ay kira + depozito + personel + pazarlama

## EKİPMAN BÜTÇE DIŞI

TRIMODE arena ve tüm antrenman ekipmanı işverence temin edilmiştir; hiçbir kalemden yer almaz.

# Beş madde — sırayla

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev C

1

## YERİNDE ÖLÇÜM GÜNÜ

Tavan yüksekliği, pis su kotu ve konumu, elektrik pano gücü/trifaze, kolon konumları, mevcut durum fotoğrafları. Yarım gün, maliyeti yok, her şeyin girdisi.

2

## TAPU · İSKÂN · YÖNETİM PLANI DOSYASI

Bağımsız bölüm niteliği ve muvafakat gerekliliği netleşmeden hiçbir imalata başlanmamalı.

3

## İSTANBUL GSİM'E YAZILI ÖN GÖRÜŞ BAŞVURUSU

Bu projenin tek kritik belirsizliği. Dilekçe ekine bu dosyanın 3. ve 5. sayfası konulabilir.

4

## PROJE MÜELLİFİ (MİMAR) TAYİNİ

1/100 onaylı vaziyet planı olmadan ne GSİM ne belediye dosyası açılabilir.

5

## BOQ İLE 3 MÜTEAHHİTTEN TEKLİF

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası hazır; teklifler aynı metraj üzerinden karşılaştırılabilir.

**İŞVERENDEN İSTENECEKLER** · DXF (R2010) · mevcut durum fotoğrafları · ölçülmüş m<sup>2</sup> ve tavan yüksekliği · ekipman listesi · pis su kotu · pano gücü · tapu niteliği ve muvafakat durumu · hedef açılış tarihi
