

ÖN TASARIM VE YATIRIM DOSYASI

MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU

MALTEPE / İDEALTEPE · İSTANBUL

103,78 m² net iç alan · Rev A · 13 Eylül 2026



Altı rakamda proje

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

NET İÇ ALAN

103,78 m²

salon 87,05 + ıslak hacim 16,73

EŞZAMANLI KAPASİTE

12 kişi

65,14 m² serbest sirkülasyon · ≈5,4 m²/kişi

TADİLAT BÜTÇESİ

1,62-2,92 M₺

önerilen senaryo · Eylül 2026 piyasa mertebesi

RUHSAT ZİNCİRİ

16-28 hafta

GSİM ön görüşten belediye ruhsatına

ŞANTIYE SÜRESİ


11 hafta

14 adım · kritik yol ıslak hacim

EKİPMAN

Bütçe dışı

işverence temin edilmiştir

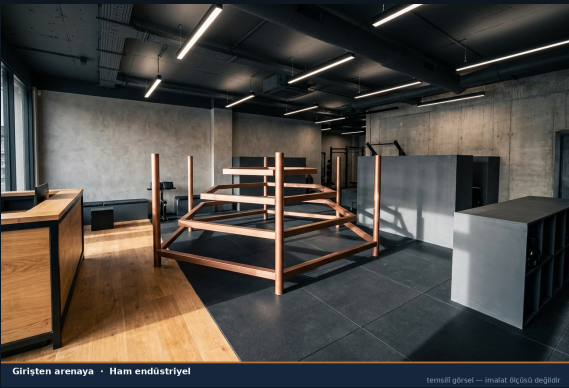

Girişten arenaya · Ham endüstriyel

temsili görsel — inaat ölçüsü değildir

BU DOSYADA NE VAR

- A3 ana dosya — 12 sayfa tasarım, mevzuat, yol haritası ve maliyet
- BoQ (.xlsx) — 46 poz, birim fiyat sütunları boş, formüller canlı
- 8 fotogerçekçi render — 4 açı × 2 stil varyantı
- Gym_Model.html — tek dosya offline 3B model, WhatsApp'tan paylaşılabilir
- Render_Promptlari.md — harici modelde yeniden üretim için

Mevzuat eşiği — projenin tek kritik belirsizliği

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

UYGULAMADA ARANAN

Çalışma (salon) alanı	$\geq 125 \text{ m}^2$
Kadın soyunma	$\geq 15 \text{ m}^2$
Erkek soyunma	$\geq 15 \text{ m}^2$
Dinlenme salonu	$\geq 15 \text{ m}^2$
TOPLAM TESİS ALANI	$\geq 170 \text{ m}^2$
Tavan yüksekliği	$\geq 2,50 \text{ m}$

BU BİRİMDE VAR OLAN

103,78 m²

net iç kullanım alanı

- Her iki bahçe de kapatılsa 161,0 m² — yine eşiğin altında.
- Yönetmelik METNİ salon için m² şartı getirmiyor: soyunma $\geq 8 \text{ m}^2$ ve dinlenme $\geq 15 \text{ m}^2$ diyor.
- Bu iki şart mevcut planda sağlanıyor (8,24 / 8,49 ve 17,33 m²).
- Karar teknik değil İDARİ. Tek yol: İstanbul GSİM'den YAZILI ÖN GÖRÜŞ.

Ön görüşün üç olası sonucu, üç rota

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

R1 ÖN GÖRÜŞ OLUMLU

- Mevcut alan yeterli görülür
- Bu dosya olduğu gibi uygulanır
- Ek maliyet yok
- Tadilat hemen başlar
- EN HIZLI SENARYO

R2 ALAN KAZANIMI GEREKİR


- Arka bahçe kapatılır → 136,60 m²
- İmar + tadilat ruhsatı gerekir
- Kat malikleri muvafakati şart
- Takvim 8-16 hafta uzar
- 170 m² yine sağlanamayabilir

R3 KAPSAM REVİZYONU

- Randevulu kişisel antrenman stüdyosu
- GSİM tescil kapsamı daraltılır
- Belediye NACE kodu buna göre
- HUKUKİ GÖRÜŞ ŞART
- Yanlış kod = kapatma riski

Alan dağılımı — tüm hesapların temeli

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

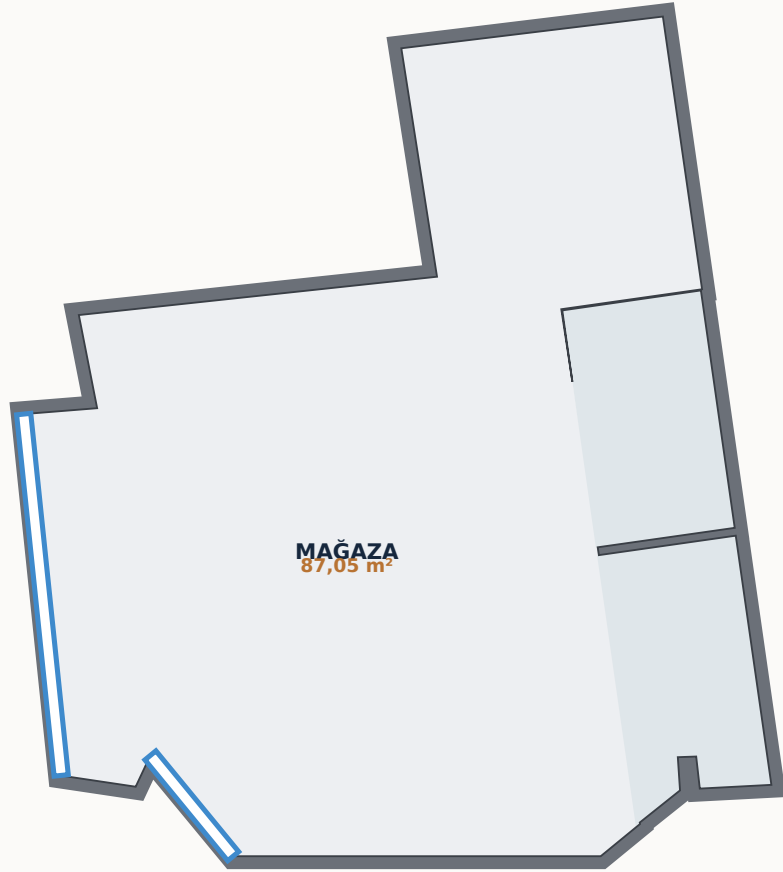


BÖLÜM	M²
Salon (açık satış alanı)	87,05
Erkek soyunma bloğu	8,24
Kadın soyunma bloğu	8,49
NET İÇ KULLANIM ALANI	103,78
Ön bahçe (açık)	24,39
Arka bahçe (açık)	32,82

ÖLÇÜ DAYANAĞI

DWG dosyası AutoCAD 2018 formatında ve bu ortamda açılmadı; PDF paftaları vektör değil raster. Geometri renk alanları izlenerek vektörleştirildi ve paftanın kendi m² etiketleriyle kalibre edildi — sapma %3'ün altında. Uygulama projesi için DXF (R2010) istenmelidir.

Yerleşim korunur, duvar hareketi asgaride

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

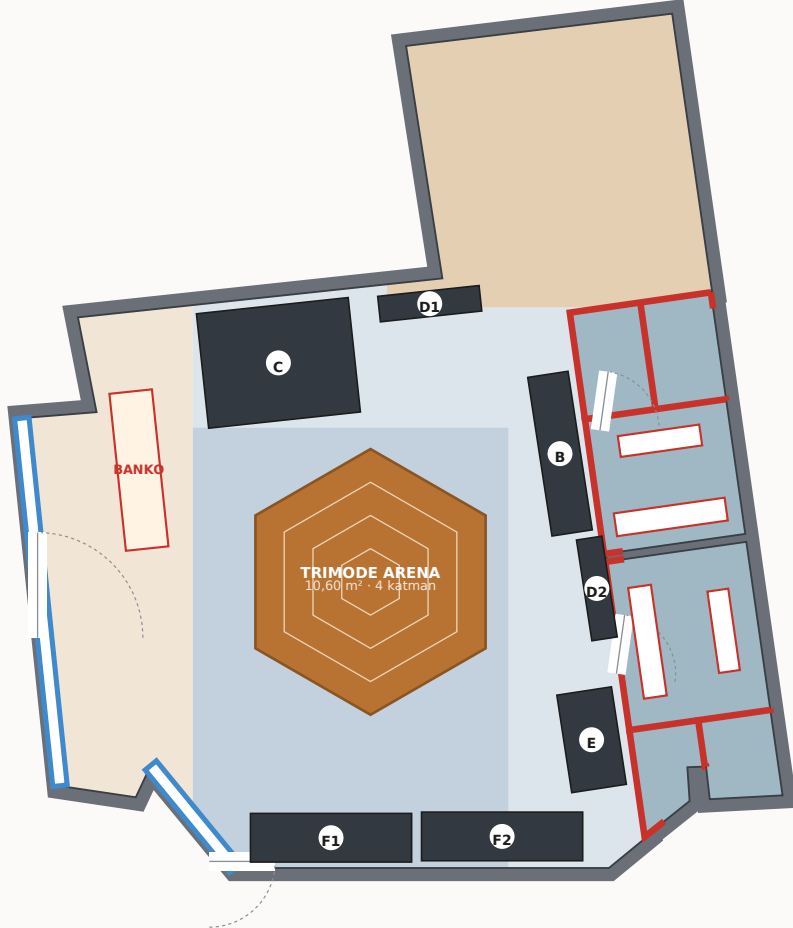

ARENA · SERBEST AĞIRLIK

31,76 m²

40 mm kauçuk + 10 mm titreşim matı

FONKSİYONEL · KARDİYO

22,31 m²

20 mm kauçuk karo

DİNLENME SALONU

17,33 m²LVT — yönetmelik şartı 15 m²

GİRİŞ · BANKO

15,65 m²

LVT · resepsiyon 2,40 m

ISLAK HACİM (2 blok)

16,73 m²


2 duş + 2 WC · R11 seramik

YENİ İMALAT NEREDE?

Kırmızı ile gösterilen tek yeni duvar imalatı, iki soyunma bloğunun içinde duş ve WC hacimlerini ayıran alçıpan bölmelerdir. Salon çerperinde hiçbir duvar hareket etmiyor.

Üç bölge — para nereye harcanıyor

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

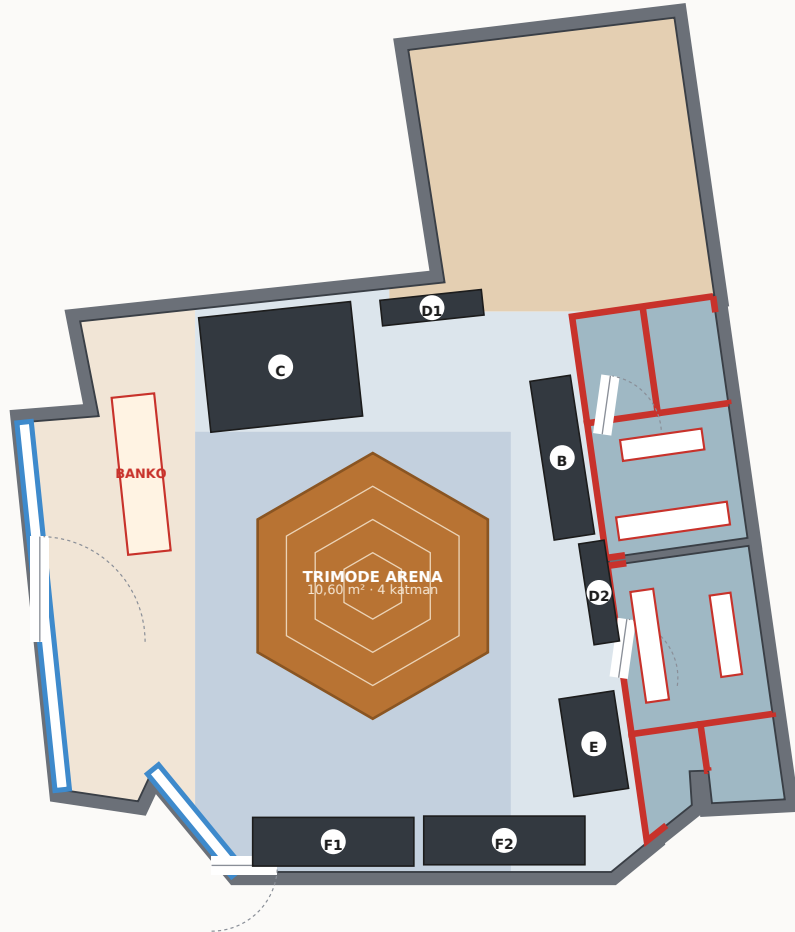

DİNLENME SALONU

17,33 m² · 8 mm

Yönetmelik dinlenme salonu için halıfleks/parke ve benzeri istiyor

GİRİŞ

15,65 m² · 8 mm

Resepsiyon ve bekleme — ıslak temizliğe uygun, fotojenik

ARENA

31,76 m² · 40+10 mm

100 kg üzeri düşürmede asgari kalınlık; altında titreşim matı

FONKSİYONEL

22,31 m² · 20 mm

Ağırlık düşürülmeyen alan — m² maliyeti %40 daha düşük

ISLAK HACİM

16,73 m² · R11 kaymaz


Duş önünde R10 yetersiz kalır; su yalıtımı 30 cm dönüşlü

AKUSTİK — RUHSAT SONRASI EN BÜYÜK RİSK

Üst katta konut bulunduğu varsayılmıştır. Ağırlık düşürme darbesi döşemeden yapısal ses olarak iletilir ve şikâyet → kapatma riski doğurur. Arena altına 10 mm titreşim matı serilir ve işletme kuralı olarak ağırlık düşürme yasaklanır.

Maliyetin kalbi — ve tek bilinmeyeni

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

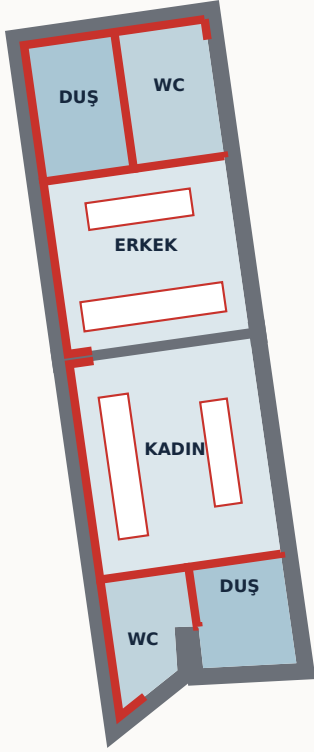

ÖLÇÜT	SEÇENEK A — ZEMİN YÜKSELTME	SEÇENEK B — ATIK SU POMPASI
Kalem bedeli	14.220 - 23.422 TL	72.000 - 128.000 TL
Kot serbestliği	Mevcut kota bağımlı	Tam serbest
Kullanım etkisi	15-20 cm basamak doğar	Kot değişmez, eşiksiz
Bakım / arıza riski	Yok	Pompa arızası kullanımı durdurur
Elektrik bağımlılığı	Yok	Var — kesintide kullanılamaz
ÖNERİ	TERCİH EDİLEN	Yalnız A uygulanamazsa

SÖKÜM SONRASI İLK İŞ

Mevcut pis su bağlantısının kötü ve konumu BİLİNİYOR. Bu tek ölçüm, A/B kararını ve dolayısıyla tüm zemin imalatlarının sırasını kilitler. Yönetmelik şartı olan 2 duş + 2 WC her iki seçenekte de sağlanır.

Kapasite hesabı — kişi başı debiden başlayarak

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

TAZE HAVA

1.000 m³/h71 m³/h-kişi · yasal asgari 30

HAVA DEĞİŞİMİ

3,01 h⁻¹iç hacim 332,1 m³

SOĞUTMA

57.000 BTU

3 × 24.000 split — VRF yerine

TALEP GÜCÜ

12,2 kW

trifaze 3×25 A abonelik önerilir


AYDINLATMA BÖLGESİ	M ²	LUX HEDEFİ	ARMATÜR TİPİ	ADET
Arena / serbest ağırlık	31,76	500	Lineer 40 W	7
Fonksiyonel / kardiyo	22,31	300	Lineer 40 W	3
Dinlenme salonu	17,33	300	Lineer 40 W	3
Giriş / banko	15,65	300	Lineer 40 W	2
Soyunma + duş + WC (6 hacim)	16,73	200	IP44 18 W	6
TOPLAM			15 lineer + 6 downlight	21

DOĞRULANACAK

Mevcut pano gücü ve trifaze durumu bilinmiyor. 12,1 kW talep gücü karşılanamazsa dağıtım şirketine güç artırım başvurusu gerekir — 3-8 hafta. Tavan yüksekliği de varsayım (3,20 m); değişirse armatür adedi ve taze hava debisi yeniden hesaplanır.

Sıra kritik: önce GSİM, sonra belediye

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A



TOPLAM 16-28 HAFTA

Ön görüşten belediye ruhsatına kadar. Tadilat ile evrak süreçleri paralel yürütülerek kısaltılabilir.

KOMİSYON YERİNDE GELİR


En az 5 kişilik komisyon tesisi bitmiş hâlde tetkik eder ve tutanak düzenler. Eksik tesisle başvuru ikinci tur demektir.

EN SIK HATA

Belediyeye önce gitmek. Belediye GSİM uygunluk yazısını istediği için dosya geri döner; harç ve zaman kaybedilir.

46 poz · kalem bazlı · düşük-yüksek bant

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

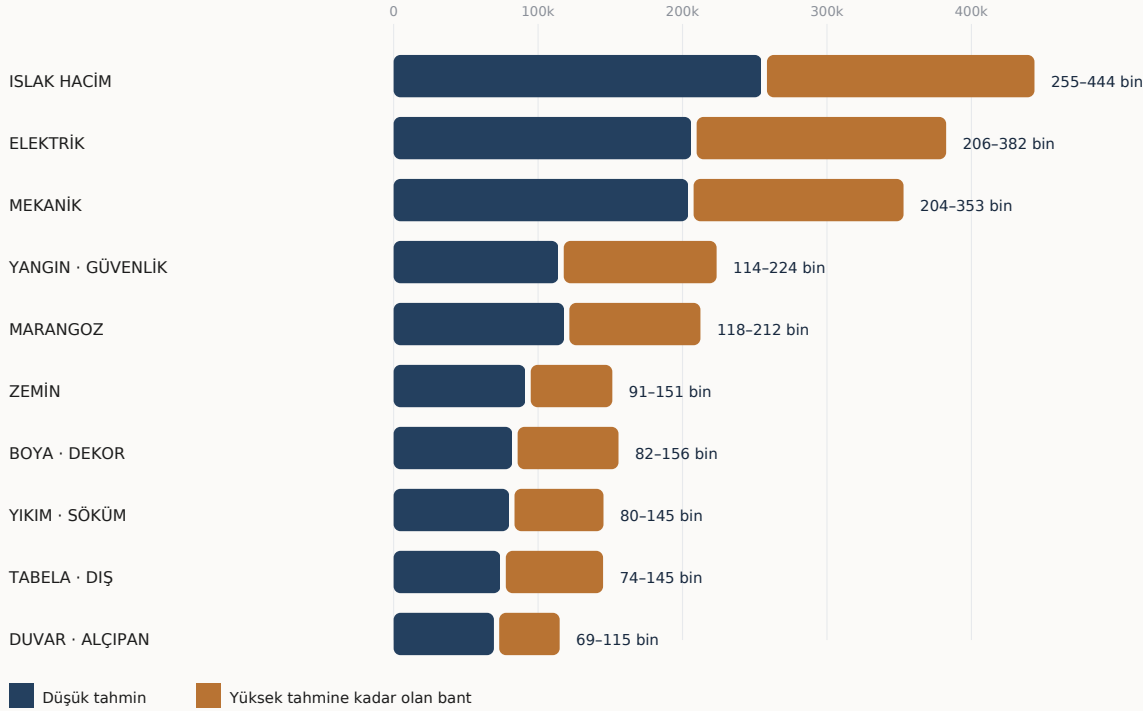

SENARYO	DÜŞÜK (TL)	YÜKSEK (TL)
MİNİMUM — yalnız zorunlu	1.371.611	2.428.835
ÖNERİLEN — akustik, ayna, tabela dâhil	1.621.845	2.917.468
Şantiye genel gideri %9 + beklenmedik %15	dâhil	dâhil

AÇILIŞ ÖNCESİ TOPLAM NAKİT

2,23-4,11 M₺

tadilat + ruhsat/harç + 3 ay kira + depozito + personel + pazarlama

EKİPMAN BÜTÇE DIŞI

TRIMODE arena ve tüm antrenman ekipmanı işverence temin edilmiştir; hiçbir kalemdede yer almaz.

Beş madde — sırayla

Gym Dönüşüm Dosyası · Rev A

1

YERİNDE ÖLÇÜM GÜNÜ

Tavan yüksekliği, pis su kotu ve konumu, elektrik pano gücü/trifaze, kolon konumları, mevcut durum fotoğrafları. Yarım gün, maliyeti yok, her şeyin girdisi.

2

TAPU · İSKÂN · YÖNETİM PLANI DOSYASI

Bağımsız bölüm niteliği ve muvafakat gerekliliği netleşmeden hiçbir imalata başlanmamalı.

3

İSTANBUL GSİM'E YAZILI ÖN GÖRÜŞ BAŞVURUSU

Bu projenin tek kritik belirsizliği. Dilekçe ekine bu dosyanın 3. ve 5. sayfası konulabilir.

4

PROJE MÜELLİFİ (MİMAR) TAYİNİ

1/100 onaylı vaziyet planı olmadan ne GSİM ne belediye dosyası açılabilir.

5

BOQ İLE 3 MÜTEAHHİTTEN TEKLİF

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası hazır; teklifler aynı metraj üzerinden karşılaştırılabilir.

İŞVERENDEN İSTENECEKLER · DXF (R2010) · mevcut durum fotoğrafları · ölçülmüş m² ve tavan yüksekliği · ekipman listesi · pis su kotu · pano gücü · tapu niteliği ve muvafakat durumu · hedef açılış tarihi
